



Agence canadienne de
développement international

Canadian International
Development Agency

Canada

**Projet « Appui à la Gouvernance Locale dans le Département du Nord-Est »
Rapport annuel 2008
Janvier à Décembre 2008**



Production maraîchère au périmètre Gaston

Décembre 2008

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le rapport annuel 2008 rend comptes des résultats obtenus par le projet au cours de l'année malgré un environnement national et local des plus déprimants. En effet, l'année qui s'achève a été marquée par les émeutes de la faim du mois d'avril qui ont entraîné le renvoi du gouvernement par le Sénat d'une part, et d'autre part, par le passage de quatre ouragans violents laissant des familles en deuil, des plantations ravagées et une économie moribonde.

Toutefois, le projet a su maintenir le cap sur les quatre enjeux majeurs retenus pour l'année à savoir :

- a. La fonctionnalité des investissements réalisés dans le cadre de l'accompagnement du projet;
- b. La promotion constante auprès des acteurs locaux partenaires d'activités génératrices de revenus et d'emplois permanents;
- c. La poursuite des actions de renforcement des capacités des acteurs locaux des institutions étatiques et non étatiques pour une meilleure efficacité de l'offre des services fournis localement;
- d. La systématisation de la fonction de suivi participatif et la fonctionnalité du système de gestion informatisé.

Les principaux résultats obtenus au cours de la période vis-à-vis de ces enjeux confirment le haut degré de maturité des acteurs locaux accompagnés et le crédit de qualité dont le projet fait l'objet auprès de tous ses partenaires.

Les infrastructures de services administratifs mis en place sont pleinement opérationnelles. Des actes de l'Etat civil ainsi que des autorisations municipales sont délivrés dans le délai régulier, des registres et des archives sont bien tenus et des incitations aux contribuables leur portent à mieux comprendre leurs obligations de payer les impôts. Environ 2000 familles dans la section communale de Bois de Laurence ont maintenant accès à de l'eau potable à proximité de leur résidence. Un total de 33 microprojets économiques priorisés par les bénéficiaires dont 18 financés par le FAES et 15 par le FENU ont été exécutés et les bénéficiaires récolteront les premiers fruits dès le premier trimestre de l'année 2009.

Parallèlement, 2082 acteurs locaux sont devenus de véritables agents de développement de leurs collectivités grâce aux séances de formation suivies dans des thématiques variées telles : Gestion du développement local, Élaboration et Gestion de projet, Maîtrise d'ouvrage local, Droit et Devoir et Application de la loi 4 avril 1996, Leadership et Développement Communautaire, Gestion de groupe, Gestion de conflit et résolution de Problème, Profit, Déficit, Intérêt, Amortissement, Bilan, Actif, Passif, Calcul rentabilité économique des activités, Compte de résultat etc.

Un sous-système de suivi participatif fonctionne à travers un mécanisme centré sur le Comité Communal de Suivi assisté de l'agent de suivi mis à disposition de la collectivité communale.

Le conseil municipal détient progressivement les informations sur ce que font les intervenants extérieurs dans sa juridiction en attendant que la municipalité soit constituée un passage obligé. A l'interne au projet, le système de gestion informatisée des données (SGI) est redevenu opérationnel.

Parmi les grandes réussites en 2008 se détachent la concrétisation du partenariat stratégique avec le FAES par le financement direct de 22 projets totalisant plus de 2 millions de dollars américains, une contribution inédite du PNUD au projet et la prise en compte d'une partie des activités dans le Programme d'Investissement Public du Gouvernement.

Le projet a épuisé toutes les ressources budgétaires mises à sa disposition pour financer les activités programmées et dans beaucoup de cas a dépassé les cibles prévues. Sur les 17, 509,743.26 gourdes des fonds FIC et FE investies dans la ZIP, un volume important soit 9, 663,335.41 gourdes ont été injectées dans l'économie régionale et locale sous forme d'achats de matériaux et de services de main d'œuvre.

Il est réconfortant d'observer que des nouvelles pratiques de bonne gouvernance tendent à s'imposer progressivement pour garantir la transparence à travers l'information, la reddition de comptes, l'appel à la concurrence pour les marchés publics, le suivi participatif des activités, la gestion responsable des ressources naturelles et l'attitude de plus en plus compréhensive et respectueuse des jeunes écoliers vis-à-vis de leur environnement naturel.

Le présent rapport indique les différents résultats obtenus dans les différents domaines (microprojets, gestion et mobilisation de fonds) au regard des objectifs fixés pour 2008.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE EXÉCUTIF	1
ACRONYMES ET ABREVIATIONS	5
1. INTRODUCTION	6
1.1 Contexte national	7
1.2 Contexte local	7
2. BILAN 2008	8
2.1 Fonctionnalité des investissements	9
2.2 Promotion des activités génératrices de revenus et d'emplois permanents	9
2.3 Renforcement des capacités	10
2.4 Systématisation de la fonction de suivi participatif	11
2.5 Atteintes des cibles et taux d'exécution budgétaire.	11
3. Bilan 2008 selon l'approche de gestion axée sur les résultants.	38
3.1 Processus de planification	38
3.2 Fonds d'investissement communal et Fonds environnemental par commune	39
3.3 Répartition des investissements par secteur	43
3.5 Incidence du flux monétaire de l'investissement FIC/FE	48
3.6 Aspect genre	49
3.7 Renforcement des capacités	52
3.8 Volet environnement	59
3.8.1 Formation des planteurs sur les techniques de conservation des sols	59
3.8.2 Intensification de la culture maraîchère	59
3.8.3 Éducation Environnementale	60
3.9 Partenariats	60
4. Rapport financier agrégé par produit	61
4.1 Condensé des résultats obtenus par produit	62
ANNEXE 1 : Rapport de l'atteinte des cibles par produits	65
ANNEXE 2 : Rapport de l'atteinte des cibles par activités	71
ANNEXE 3 : Liste des microprojets financés	76

ACRONYMES ET ABREVIATIONS

ACDI	Agence Canadienne de Développement International
ADA	Auto Diagnostic Accompagné
ASEC	Assemblée de la Section Communale
BID	Banque Interaméricaine de Développement
BM	Banque Mondiale
BPM	Bureau du Premier Ministre
CAP	Celle d'Appui du Projet
CASEC	Conseil d'Administration de la Section Communale
CCC	Comité Consultatif Communal
CCI	Cadre de Coopération Intérimaire
CCSC	Comité Consultatif de la Section Communale
CGFS	Comité de Gestion des Fonds et Subventions
CS	Comité de Suivi
CT	Collectivités Territoriales
DP/CCF/HAI/2	Deuxième Cadre de Coopération avec Haïti
EFH	Égalité femme/homme
FE	Fonds environnemental
FENU	Fonds d'Équipement des Nations Unies
FIC	Fonds d'Investissement Communal
MARNDR	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
ME	Ministère de l'Environnement
MEF	Ministère de l'Économie et des Finances
MICT	Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales
MINUSTAH	Mission de Stabilisation des Nations Unies en Haïti
MPCE	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
OCB	Organisation Communautaire de Base
OE	Opérateur Environnemental
OMD	Objectif du Millénaire pour le Développement
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PDL	Plan de Développement Local
PDLH	Programme de Développement Local en Haïti
PIB	Produit Intérieur Brut
PIC	Programme d'Investissement Communal
PIE	Programme d'Investissement Environnemental
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
SIG	Système de Gestion de l'Information
SC	Société Civile
S/E	Suivi Évaluation
TRC	Table Ronde de Concertation
UCS	Unité Centrale de Suivi
UDL	Unité pour le Développement local
UE	Union Européenne
UNDAF	Cadre de Coopération du Système des Nations Unies
ZIP	Zone d'Intervention du Projet

1. INTRODUCTION

Au cours des trois années et demies de sa phase d'extension, le projet Appui à la Gouvernance Locale dans le Département du Nord-Est (AGLNE) continue d'obtenir des résultats probants et efficaces dans les huit communes accompagnées vers l'atteinte des deux objectifs initialement définis que sont : a) **un objectif de développement** qui est de contribuer à réduire la pauvreté des populations rurales d'une manière durable en améliorant la gouvernance locale et en augmentant la production, tout en respectant l'environnement et b) **un objectif immédiat** qui prévoit l'offre et l'utilisation des services et biens publics et de ressources naturelles augmentent de manière durable par le biais d'une bonne gouvernance locale.

Dans la poursuite de ces objectifs, le projet a concentré ses actions sur deux grands axes : la promotion de la bonne gouvernance et la gestion responsable et améliorée des ressources naturelles au sein de vingt deux (22) collectivités locales sur les vingt neuf (29) collectivités de la zone d'intervention du projet (ZIP).

En matière de bonne gouvernance, l'accompagnement fourni par le projet a eu pour résultats : l'élaboration et la mise en œuvre suivant l'approche participative inclusive de 22 plans de développement local (PDL) dont 6 plans d'investissement communal (PIC) et 16 plans d'investissement environnement (PIE). Durant la période couverte par ces plans (2005-2008), le projet à l'aide de ses ressources propres et de celles mobilisées auprès des partenaires institutionnelles a facilité l'exécution de 108 projets d'infrastructures socioéconomiques et générateurs de revenus prioritaires par les populations concernées. Environ 4.3 millions de dollars américains ont été investis dans la ZIP. Les fonds du FENU (FIC/FE) ont contribué à hauteur de 27 %.

En matière de gestion des ressources naturelles et de réalisation d'activités économiques, les aménagements parcellaires par des structures antiérosives sur 1.583 hectares de terres, la mise en terre de 250.000 plantules composées d'espèces fruitières et forestières, la correction de 10 km de ravines et l'éducation à l'environnement de 60 professeurs et 2500 élèves des classes fondamentales ont permis de freiner l'érosion, d'augmenter la couverture végétale, d'améliorer la fertilité et la productivité du capital foncier et enfin de mieux préparer/outiller la génération future pour la protection et la gestion responsable des ressources naturelles. L'aménagement des parcelles dégradées surplombant les lagons ont permis la multiplication par 3 le rendement du riz qui y est planté. Tandis que la vulgarisation des nouvelles techniques de production d'igname (mini set), de cultures maraîchères et d'haricots, les microprojets d'amélioration génétique des races caprines et bovines ainsi que l'implantation de nouvelles unités de transformation de grains ont entraîné une augmentation sensible de la production agricole et d'élevage et conséquemment une augmentation des revenus d'au moins 10 % des ménages agricoles de la ZIP

Il est réconfortant d'observer que des nouvelles pratiques de bonne gouvernance tendent à s'imposer progressivement pour garantir la transparence à travers l'information, la reddition de comptes, l'appel à la concurrence pour les marchés publics, le suivi participatif des activités.

Enfin, il est à noter que trop souvent le projet se retrouve le seul intervenant extérieur dans les collectivités les plus éloignées et enclavées (Corosse, Grosse Roche, Trois Palmistes) de la ZIP ; lesquelles par surcroît sont les plus pauvres et les plus marginalisées.

Le présent rapport indique les résultats obtenus pour les différents produits au regard des cibles prévues pour l'année 2008.

1.1 Contexte national

Sur le plan national, les éléments majeurs au cours de l'année 2008 ont été sans conteste les émeutes de la faim du mois d'avril liées en partie à l'augmentation des cours mondiaux du pétrole et des produits alimentaires de base qui ont entraîné, entre autres, le renvoi du Gouvernement du Premier Ministre Jacques Edouard Alexis par le Parlement et son remplacement après quatre mois de gestion des affaires courantes d'une part. D'autre part, le passage de quatre ouragans de forte intensité a fortement endommagé les maigres infrastructures économiques et sociales aggravant ainsi les conditions de vie déjà précaires de la grande majorité de la population urbaine et rurale. Plus d'un million de personnes sont affectées par les orages avec des vies des proches perdues, des maisons et habitations inondées, des récoltes détruites et du bétail emporté. La situation est particulièrement grave dans le secteur agricole, car beaucoup de jardins ont été dévastés juste avant la récolte. Cette situation va entraîner certainement un énorme recul de l'économie du pays après une légère remontée du PIB (2,5 %) au cours des trois dernières années. La récession économique mondiale qui se confirme chaque jour qui passe aura sans aucun doute des effets négatifs sur l'économie et la société haïtiennes étant donné la forte dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Une réduction des flux de transfert monétaires des émigrés haïtiens qui avoisinent le milliard de dollars américains l'an induirait une baisse significative des capacités des ménages nationaux à satisfaire leurs besoins de base (alimentation, santé, éducation, logement..).

Enfin, la non organisation des élections pour le renouvellement du tiers du Sénat (départ de 10 sénateurs avec mandat de deux ans et un décédé) rend fragile un quorum de 16 présences pour tenir séance au Grand Corps. Le nouveau texte de loi sur les élections remis au Conseil Électoral Provisoire (CEP) ne considère que les élections sénatoriales laissant dans l'oubli les prescrits constitutionnels d'organisation des élections indirectes pour la formation de l'assemblée municipale, l'assemblée départementale et le conseil départemental. Les collectivités communales sont encore orphelines de leur assemblée qui conformément à la Constitution est un organe délibératif placé à côté du Conseil Municipal et dont les membres élus au suffrage indirect proviennent des Assemblées des Sections Communales et des délégués de ville. L'action des Pouvoirs Publics au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal qui commence au 1^{er} octobre est marquée par la gestion des urgences au détriment du développement.

1.2 Contexte local

Les collectivités locales du Département du Nord-Est ont du faire face aux retombées négatives des chocs externes et des cataclysmes naturels qu'a connus le pays. En plus de connaître une hausse vertigineuse des prix allant du simple au triple, les principaux produits alimentaires de base (riz, maïs, blé, huile de cuisine, sucre), les produits pétroliers (gazoline, gasoil, huile de moteur) et les matériaux de construction (barre d'acier, ciment) n'étaient pas disponibles pendant au moins deux mois. Ceci était dû aux dommages causés aux routes et aux ponts par les ouragans rendant ainsi le transport routier non fonctionnel. Le calendrier d'exécution de certains projets a du être réajusté de même que le montant de certains budgets amandés.

Toutefois, il a été encourageant de noter au cours de l'année 2008 que la participation des populations locales, notamment des femmes a augmenté dans toutes les activités accompagnées par le projet, que les prestations et les capacités administratives au niveau local sont renforcées, en particulier au niveau des bureaux d'Officier de l'État civil, en considérant le nombre d'actes de naissance, de mariage et de décès délivrés, et que le devoir de redevabilité des gestionnaires de fonds vis-à-vis de la société civile locale s'implante progressivement.

A l'interne au projet, des vacances de postes pour des raisons de santé ou familiales ont dû être comblées par trois nouveaux cadres pour reconstituer l'Unité Environnementale basée à Mont-Organisé, ceci a induit le démarrage au troisième trimestre des activités environnementales. De plus, sur financement du Trésor Public à travers le MPCE, un expert national en développement local, un expert en élaboration de projets et un chauffeur ont été recrutés sur concours en octobre dernier pour former l'Unité d'Accompagnement Technique de la commune de Sainte Suzanne et de ses six sections communales en vue de la réplication du processus de planification participative.

En outre, pour faire le point sur les résultats intermédiaires du projet un audit et une évaluation à mi-parcours viennent d'être réalisés au dernier trimestre de l'année.

2. BILAN 2008

Quatre enjeux majeurs devaient constituer les centres d'intérêt des diverses interventions menées dans le cadre du projet au cours de l'année 2008 :

- e. La fonctionnalité des investissements réalisés dans le cadre de l'accompagnement du projet;
- f. La promotion constante auprès des acteurs locaux partenaires d'activités génératrices de revenus et d'emplois permanents;
- g. La poursuite des actions de renforcement des capacités des acteurs locaux des institutions étatiques et non étatiques pour une meilleure efficacité de l'offre des services fournis localement;
- h. La systématisation de la fonction de suivi participatif et la fonctionnalité du système de gestion informatisé.

Les principaux résultats obtenus au cours de la période vis-à-vis de ces enjeux confirment le haut degré de maturité des acteurs locaux accompagnés et le crédit de qualité dont le projet fait l'objet auprès de tous ses partenaires.

2.1 Fonctionnalité des investissements

Grâce aux actions de formation des responsables locaux, à la fourniture d'un minimum d'équipements et à l'octroi de subventions de redémarrage dans quelques cas, les dysfonctionnements observés lors des exercices de suivi des infrastructures administratives, sociales et économiques mises en place ont été rectifiés pour la plupart. Les unités de services administratifs (Services de la municipalité, Bureau de l'Officier de l'État Civil et l'Agence Locale des Impôts) logeant dans les cinq complexes administratifs sont actuellement opérationnelles. Les archives de l'administration communale sont bien tenues, plus de 300 naissances ont été enregistrées et des actes livrés, une cinquantaine de certificats de décès livrés, des enquêtes sont en cours pour actualiser les rôles des impositions fiscales en vue d'enrôler les contribuables potentiels. Les trois centres de stockage des associations de femmes réaménagés et recapitalisés ont effectué sans trop grande contrainte leurs opérations d'achat et de revente de maïs en grain, de haricots noirs, du roucou et d'arachide avec une marge bénéficiaire de plus de 25%.

Les deux petits systèmes d'adduction d'eau potable par gravitation à Bois de Laurence, section communale de la commune de Mombin Crochu, chacun avec un réservoir de 2500 gallons, 8 bonnes fontaines, desservent 2000 familles par jour, soit 12,000 personnes. Un technicien en gestion du SAEP est mobilisé pour appui technique. Chaque sous-système a un comité de gestion/entretien formé de 7 membres (3 F et 4 H). Une cotisation annuelle de 35 gourdes par famille est approuvée par consensus pour être déposée dans un compte de la caisse populaire du milieu à des fins d'entretien, en vue de pérenniser le fonctionnement du système.

Le centre ménager à Capotille réhabilité en 2007 est restructuré. Un comité de parents de 6 membres (2 F et 4 H) en assure la gestion et veille notamment à la bonne utilisation des matériels (4 machines simples, 4 machines perfectionnées Mero, 2 bureaux, 6 tables, 60 chaises, 1 classeur, 1 buffet, 1 four avec 2 bonbonnes de gaz propane). Trois (3) enseignants assurent les cours de formation en couture et cuisine dont deux payés par le MENFP et le dernier par la communauté. La première promotion de 49 étudiants-es (47F + 2 H) en 2007 compte 36 en 2^e année ; la deuxième promotion a déjà reçu 37 nouveaux inscrits.

2.2 Promotion des activités génératrices de revenus et d'emplois permanents

Le projet a développé une stratégie agressive de sensibilisation des populations locales sur la nécessité d'identifier des produits ou des filières pour lesquels une certaine maîtrise de la production existe dans le milieu ainsi que des marchés potentiels pour leur écoulement, en vue de créer de la richesse et de réduire la pauvreté dans la ZIP. Des formations en entrepreneuriat rural avec l'aide du PDLH ont été données à 26 gestionnaires d'unités de transformation de produits agricoles et d'autres en gestion des produits de l'élevage à 1740 petits éleveurs avec l'aide du FAES.

Le décompte des microprojets économiques priorités par les bénéficiaires pour 2008 donne 33 dont 18 financés par le FAES et 15 par le FENU. Il s'agit pour la plupart des projets d'amélioration génétique de caprins et de bovins, de développement de cultures maraîchères, d'extension de la production d'igname, d'attelage, de transformation de grains: maïs, riz, arachide. A titre d'exemple **1140 exploitants/éleveurs** ont reçu 2280 chèvres + 18 géniteurs. Selon les procédures de distribution adoptées, les 1140 bénéficiaires devront rembourser chacun ou chacune les deux chèvres reçues en emprunt. Ainsi dans moins d'un an il y aura 4560 chèvres pour 2280 nouveaux exploitants (es) et ainsi de suite. Le nombre de chèvres croîtra à un rythme exponentiel tenant compte de la prolificité de races caprines, en plus des avantages liés à l'amélioration des performances zootechniques, la valeur économique qui en résulterait à court terme serait relativement important pour chaque bénéficiaire voire l'ensemble des bénéficiaires réunies, lorsqu'on considère que le prix moyen d'une chevrette (d'un chevreau) après sevrage est de 1600 gourdes/boucs améliorés. L'assiette fiscale sera élargie véritable élément de conditionnalité du développement local.

2.3 Renforcement des capacités

Un effectif de 1167 cadres et acteurs locaux des mairies, des CASEC, des ASEC, des structures mixtes de concertation, des bureaux agricoles communaux, des OCB dont 365 femmes, sont à l'avant-garde du progrès, comprennent mieux leur rôle comme agents de développement et gestionnaires de leurs communes et sections communales, suite aux 25 sessions de formation organisées à leur profit sur les thématiques suivantes: Gestion du développement local, Élaboration et Gestion de projet, Fonctionnalité des Mairies, Maîtrise d'ouvrage local, Droit et Devoir et Application de la loi 4 avril 1996, Leadership et Développement Communautaire, Gestion de groupe, Gestion de conflit et résolution de Problème, Importance EFH dans le Développement, Système de numérotage des maisons et Méthode de calcul des impôts locaux.

Parallèlement d'autres sessions de formation ciblées ont amélioré le savoir faire des agents économiques locaux notamment les femmes. Pour preuve :

- ✚ **81** femmes issues des 3 groupements (AFS, RFS, MFTKJ) formées en " Technique de stockage des semences, Commercialisation des produits agricoles, Gestion de petit projet et comptabilité.
- ✚ **18 F** sur 40 participants-es de 2 sections communales (Savane Longue et Savanette) formées en techniques de plantation légumes, de préparation de sol, des insecticides naturels et engrais naturels solides.
- ✚ **39 F** sur 129 participants-es venant de Bas des Perches, Trois Palmistes, Bois de Laurence, Gens de Nantes et Mombin Crochu formés (ées) en techniques de protection de l'environnement.
- ✚ **15 F** sur 32 participants-es venant de Mombin Crochu formés (ées) en leadership communautaire, gestion de groupes et conflits, résolution problèmes.
- ✚ **17 F** sur 35 participants-es venant de Gens de Nantes formés (ées) en techniques d'élevage amélioré.

- ✚ **21 F** sur 64 participants-es venant de Corosse, Bois de Laurence, Mombin Crochu, Sans Souci, Bas des Perches, Haut des Perches, Perches, Trois Palmistes formés (ées) sur les Outils de Gestion financière.
- ✚ **5F** présidentes de 5 CLE sur 8 microprojets socio-économiques (2 aux Perches, 2 à Capotille, 2 à Gens de Nantes, 1 à Mont Organisé et 1 à Mombin Crochu) financés par le projet AGL-NE et le FAES.

2.4 Systématisation de la fonction de suivi participatif

Dans le domaine du suivi des interventions menées dans la ZIP, un sous-système de suivi participatif fonctionne à travers un mécanisme centré sur le Comité Communal de Suivi (CCS) formé d'un maire adjoint coordonnateur, d'un membre de chaque CASEC et de chaque ASEC, d'un secrétaire et d'un responsable de relations publiques désignés par le CCC. L'agent de suivi mis par le projet à disposition de la mairie joue un rôle de facilitateur. Le CCS est un organe du CCC. Ses attributions sont de s'informer des projets retenus et mis en œuvre, de suivre l'évolution des travaux, d'alerter le CCC de tout écart constaté et d'aider éventuellement à résoudre certains problèmes. Cinq CCS sur sept sont fonctionnels. Le conseil municipal détient progressivement les informations sur ce que font les intervenants extérieurs dans sa juridiction en attendant que la municipalité constitue un passage obligé.

Parallèlement, l'outil de gestion des données élaboré par le FENU, le MIS/SGI (**S**ystème de **G**estion de l'**I**nformation), utilisant le logiciel « **Access** », est maintenant en application au sein du projet pour la saisie et le traitement automatique de données relatives à la gestion interne du projet AGL-NE avec possibilité d'extension aux collectivités locales accompagnées et aux services de l'Etat. Cet outil renferme 9 fenêtres parmi lesquelles 4 (Planification, Dépenses public, Investissements et Entretien, Renforcement des capacités) sont réservées aux données relatives aux collectivités locales, et 1 (Outils de GAR) strictement réservé aux données du cadre logique et PTA du projet AGL-NE notamment les résultats/produits attendus, indicateurs définis, activités programmées, cibles et allocation de budget. Spécifiquement à « Outils de GAR », la saisie des données est à jour pour les années 2007 et 2008.

2.5 Atteintes des cibles et taux d'exécution budgétaire.

Le tableau # 1 qui suit est extrait du MIS et présente pour l'année 2008 : les cibles prévues, les résultats atteints et les taux d'exécution budgétaire par produit. Comme il est indiqué, le projet a épuisé toutes les ressources budgétaires mises à sa disposition pour financer les activités programmées et dans beaucoup de cas dépassé les cibles prévues.

Tableau # 1

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget			
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%	

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.1 Appui aux CT dans l'établissement du bilan de réalisations en 2007 et la programmation d'activités pour 2008

Indicateur sous-activité Nombre de bilans (communaux et de sections communales) annuels réalisés

Responsable de CAP

23	23	100	1,842	1,827	99
----	----	-----	-------	-------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.3 Rencontre avec les parlementaires du Département du Nord-Est sur la démarche du projet

Indicateur sous-activité Nombre de parlementaires du Nord-Est sensibilisés

Responsable de CAP

2	2	100	200	107	54
---	---	-----	-----	-----	----

Explication Les rencontres tenues avec les 2 parlementaires sont informelles, des documents leur été distribués

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget			
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%	

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.4 Spots et émissions de radio sur les activités du projet aux niveaux local et départemental

Indicateur sous-activité Nombre de diffusion de la série de 12 émissions

Responsable de CAP

234	234	100	1,000	1,000	100
-----	-----	-----	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.5 Formation des élus et des cadres des collectivités territoriales en gouvernance locale

Indicateur sous-activité Nombre d'élus et cadres formés et nombre de séminaires organisés

Responsable de CAP

244	216	88.52	17,900	17,806	99
-----	-----	-------	--------	--------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.6 Poursuite de la mise en application de la stratégie genre du projet

Indicateur sous-activité Nombre de cadres (H/F) du projet et d'autres partenaires de terrain formés

Responsable de CAP

41	26	63.41	2,000	1,324	66
----	----	-------	-------	-------	----

Explication Formation réalisée par une consultante en mission pour le PDLH, mais payée avec moins participants-es que l'effectif prévu

Action corrective S/O

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.7 Diffusion des émissions de radio sur la problématique genre

Indicateur sous-activité Nombre de diffusion des émissions

Responsable de GED

4	4	100	500	500	100
---	---	-----	-----	-----	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.8 Célébration des journées internationales consacrées à la femme

Indicateur sous-activité Nombre de journées célébrées

Responsable de CAP

3	3	100	500	466	93
---	---	-----	-----	-----	----

Explication Il y a des dates fixes (8 mars, 15 octobre et 25 novembre) pour la célébration de ces journées internationales, malgré que la Responsable GED ne fait plus partie de l'équipe les CL s'organisent elles-mêmes avec l'appui du projet AGLNE

Action corrective S/O

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.9 Impression et distribution des PIC et des PIE produits

Indicateur sous-activité Nombre de PIC et PIE distribués

Responsable de CAP

300	475	158.33	1,000	1,503	150
-----	-----	--------	-------	-------	-----

Explication Demande plus élevée de la part des CL

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.10 Visite entre les pairs

Indicateur sous-activité Nombre de visites et visiteurs (H/F)

Responsable de CAP

4	4	100	2,500	2,495	100
---	---	-----	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.1 Appuyer l'Existence dans les communes et les sections communales de plans de développement et d'investissement intégrant la dimension ES

Sous-activité 1.1.11 Sensibiliser les acteurs locaux sur la participation des femmes

Indicateur sous-activité Nombre d'acteurs locaux sensibilisés/formés

Responsable de GED

60	53	88.33	500	454	91
----	----	-------	-----	-----	----

Explication Certains acteurs locaux ont été absents des séances réalisées

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget			
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%	

Activité 1.2 Appuyer la Consolidation des structures de concertation existantes dans le Nord-Est et recherche de la parité entre les sexes

Sous-activité 1.2.1 Appui au bon fonctionnement des CCC dans les anciennes communes

Indicateur sous-activité Nombre de CCC et CS appuyés et fonctionnels

Responsable de DL

18	18	100	1,500	1,502	100
----	----	-----	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.2 Appuyer la Consolidation des structures de concertation existantes dans le Nord-Est et recherche de la parité entre les sexes

Sous-activité 1.2.2 Appui au bon fonctionnement des CCSC dans les anciennes sections communales

Indicateur sous-activité Nombre de CCSC appuyés et fonctionnels

Responsable de DL

9	9	100	3,000	2,968	99
---	---	-----	-------	-------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.2 Appuyer la Consolidation des structures de concertation existantes dans le Nord-Est et recherche de la parité entre les sexes

Sous-activité 1.2.3 Renforcement des capacités des acteurs locaux et des organisations de base dans les anciennes collectivités

Indicateur sous-activité Nombre de membres de structures locales et d'organisation de base formés et/ou structuré

Responsable de DL

80	91	113.75	2,500	2,850	114
----	----	--------	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.2 Appuyer la Consolidation des structures de concertation existantes dans le Nord-Est et recherche de la parité entre les sexes

Sous-activité 1.2.4 Alphabétisation d'acteurs/trices locaux

Indicateur sous-activité Nombre de personnes (80% F) maîtrisant les techniques de lecture et d'écriture en créole

Responsable de GED

350	663	189.43	27,000	28,374	105
-----	-----	--------	--------	--------	-----

Explication Demande plus élevée exprimée par les CL fait que chaque centre fonctionne en 2 temps, cela augmente les cibles annuels prévus (350 dont 80% F) à 663 (dont 80% F: 527)

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.3 Appuyer l'Emergence de nouvelles structures de concertation locales sur la base du modèle existant

Sous-activité 1.3.1 Appui au bon fonctionnement des CCC dans les nouvelles communes

Indicateur sous-activité Nombre de CCC et CS appuyés et fonctionnels dans les nouvelles communes

Responsable de DL

24	24	100	2,500	2,480	99
----	----	-----	-------	-------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.3 Appuyer l'Emergence de nouvelles structures de concertation locales sur la base du modèle existant

Sous-activité 1.3.2 Appui au bon fonctionnement des CCSC dans les nouvelles sections communales

Indicateur sous-activité Nombre de CCSC appuyés et fonctionnels dans les nouvelles sections communales

Responsable de DL

13	7	53.85	2,000	1,355	68
----	---	-------	-------	-------	----

Explication Le cas des 6 CCSC prévus pour Sainte Suzanne est en veilleuse

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.3 Appuyer l'Emergence de nouvelles structures de concertation locales sur la base du modèle existant

Sous-activité 1.3.3 Organisation de séances de formation pour les acteurs locaux et les organisations de base dans les nouvelles collectivités

Indicateur sous-activité Nombre d'acteurs locaux formés en gestion de projets développement

Responsable de CAP

60	60	100	1,500	1,471	98
----	----	-----	-------	-------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 1.4 Habilier et outiller les acteurs locaux à faire un suivi adéquat des activités de développement local

Sous-activité 1.4.1 Restructuration du sous système de suivi

Indicateur sous-activité Nombre de comité de suivi constitués et restructurés en plus les agents de suivi

Responsable de S-E

6	6	100	500	489	98
---	---	-----	-----	-----	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.4 Habilitier et outiller les acteurs locaux à faire un suivi adéquat des activités de développement local

Sous-activité 1.4.2 Appui à la production/adaptation d'outils de suivi

Indicateur sous-activité Nombre d'outils de suivi produits et/ou adaptés

Responsable de S-E

5	4	80	500	412	82
---	---	----	-----	-----	----

Explication L'élaboration de l'un des outils prévus n'est pas achevé

Action corrective S/O

Activité 1.4 Habilitier et outiller les acteurs locaux à faire un suivi adéquat des activités de développement local

Sous-activité 1.4.3 Formation des agents de suivi

Indicateur sous-activité Nombre de séminaires organisés à l'intension des agents de suivi

Responsable de S-E

4	4	100	3,500	3,421	98
---	---	-----	-------	-------	----

Explication Les 2 séminaires réalisés avec l'appui du PDLH sont plus coûteux que prévus

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 1 Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 1.4 Habilitier et outiller les acteurs locaux à faire un suivi adéquat des activités de développement local

Sous-activité 1.4.4 Formation/accompagnement des structures locales de suivi

Indicateur sous-activité Nombre de sessions de formation réalisées à l'intention des structures de suivi

Responsable de S-E

6	5	83.33	1,000	893	89
---	---	-------	-------	-----	----

Explication Une session est reportée, car la programmation coïncide avec la mission d'Evaluation à mi-parcours

Action corrective S/O

Total			73,442	73,697	100
--------------	--	--	---------------	---------------	------------

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 2 Les collectivités territoriales (communes et sections) ont un accès amélioré aux sources de financement internes

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (H/F) en matière de gestion du développement local

Sous-activité 2.1.1 Restructuration / Appui au comité de gestion des fonds et subventions

Indicateur sous-activité Nombre de réunion du comité renouvelé tenue sur la répartition du budget annuel d'investissement

Responsable de CAP

1	1	100	600	555	93
---	---	-----	-----	-----	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (H/F) en matière de gestion du développement local

Sous-activité 2.1.2 Appui à la maîtrise d'ouvrage (formation en gestion de projets, suivi exécution, entretien)

Indicateur sous-activité Nombre de membres de comité de gestion formés

Responsable de Volet Infrastructure et Administratif

84	84	100	1,000	973	97
----	----	-----	-------	-----	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 2 Les collectivités territoriales (communes et sections) ont un accès amélioré aux sources de financement internes

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (H/F) en matière de gestion du développement local

Sous-activité 2.1.3 Appui à la mobilisation de ressources financières (financement d'autres partenaires)

Indicateur sous-activité Nombre de microprojets financés avec fonds externes au projet

Responsable de CAP

20	26	130	1,000	841	84
----	----	-----	-------	-----	----

Explication Dans certains cas, le coût se limite seulement en la multiplication de documents de projets et en copies distribuées aux

CL

Action corrective S/O

Total			2,600	2,369	91
--------------	--	--	--------------	--------------	-----------

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 3 Capacité des acteurs locaux à la mise en place et à l'entretien des infrastructures de base renforcée

Cibles d'exécution			Budget			
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%	

Activité 3.1 Construction et /ou réhabilitation d'infrastructures collectives de base dans les communes et les sections communales.

Sous-activité 3.1.1 Poursuite de l'exécution des projets en cours

Indicateur sous-activité Nombre de projets d'infrastructure achevés

Responsable de Volet Infrastructure

18	18	100	70,000	68,532	98
----	----	-----	--------	--------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 3.1 Construction et /ou réhabilitation d'infrastructures collectives de base dans les communes et les sections communales.

Sous-activité 3.1.2 Appui à la sélection de nouveaux projets

Indicateur sous-activité Nombre de nouveaux projets sélectionnés

Responsable de Volet Infrastructure

20	25	125	100	123	123
----	----	-----	-----	-----	-----

Explication Les 25% additionnels sont dus à la sélection de nouveaux projets tirés des PDL et pour lesquels un accompagnement a été donné sous forme de préparation de dossiers à présenter à d'autres bailleurs partenaires pour financement

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 3 Capacité des acteurs locaux à la mise en place et à l'entretien des infrastructures de base renforcée

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 3.1 Construction et /ou réhabilitation d'infrastructures collectives de base dans les communes et les sections communales.

Sous-activité 3.1.3 Appui au montage des dossiers

Indicateur sous-activité Nombre de dossiers de projets élaborés

Responsable de CAP

20	22	110	1,900	2,025	107
----	----	-----	-------	-------	-----

Explication L'un des 2 projets additionnels priorisés (20% en plus des cibles) a nécessité une étude préalable réalisée par un consultant externe

Action corrective S/O

Activité 3.1 Construction et /ou réhabilitation d'infrastructures collectives de base dans les communes et les sections communales.

Sous-activité 3.1.4 Signature d'accords de financement

Indicateur sous-activité Nombre d'accords signés

Responsable de CAP

20	20	100	100	100	100
----	----	-----	-----	-----	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 3 Capacité des acteurs locaux à la mise en place et à l'entretien des infrastructures de base renforcée

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 3.1 Construction et /ou réhabilitation d'infrastructures collectives de base dans les communes et les sections communales.

Sous-activité 3.1.5 Appui à l'exécution des projets

Indicateur sous-activité Nombre de projets appuyés

Responsable de CAP

30	36	120	124,000	171,477	138
----	----	-----	---------	---------	-----

Explication Les atteintes additionnelles des cibles et budgets plus élevés que prévus sont dus au solde positif du budget antérieur (2007)

Action corrective S/O

Total			196,100	242,257	124
--------------	--	--	----------------	----------------	------------

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 4 Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles

Cibles d'exécution			Budget			
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%	

Activité 4.1 Appuyer l'Amélioration de la gestion des ressources naturelles

Sous-activité 4.1.1 Renforcement des capacités locales en matière de protection et de gestion de l'environnement

Indicateur sous-activité Nombre de planteurs/cultivateurs membres d'organisation formés

Responsable de RNE

170	172	101.18	6,000	6,812	114
-----	-----	--------	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 4.1 Appuyer l'Amélioration de la gestion des ressources naturelles

Sous-activité 4.1.2 Mise en oeuvre de programme d'éducation environnementale

Indicateur sous-activité Nombre de conférences (2) organisée et nombre de professeurs (30) et d'élèves (800) formés

Responsable de RNE

832	832	100	2,000	2,000	100
-----	-----	-----	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 4 Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles

	Cibles d'exécution			Budget		
	Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%
Activité 4.1 Appuyer l'Amélioration de la gestion des ressources naturelles						
Sous-activité 4.1.3 Vulgarisation des techniques de conservation de sols						
Indicateur sous-activité Npmbre d'hectares aménagés						
Responsable de CAP						
	200	225	112.5	24,642	28,136	114
Explication S/O						
Action corrective S/O						
Activité 4.1 Appuyer l'Amélioration de la gestion des ressources naturelles						
Sous-activité 4.1.4 Appui à l'application de la législation environnementale						
Indicateur sous-activité Nombre de collectivités accompagnées dans l'application de la législation environnementale						
Responsable de						
	2	2	100	500	519	104
Explication S/O						
Action corrective S/O						

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 4 Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 4.1 Appuyer l'Amélioration de la gestion des ressources naturelles

Sous-activité 4.1.5 Aménagement environnemental

Indicateur sous-activité Nombre de collectivités accompagnées dans la consolidation des acquis en matière environnementale

Responsable de RNE

6	9	150	52,758	80,594	153
---	---	-----	--------	--------	-----

Explication Demande plus élevée des CL satisfaite gras au solde positif de l'année antérieure

Action corrective S/O

Activité 4.2 Appuyer l'Augmentation et diversification de la production locale des biens et services porteurs

Sous-activité 4.2.1 Appui au bon fonctionnement des associations productives

Indicateur sous-activité Nombre de groupements renforcés

Responsable de Activités Economiques

8	8	100	1,500	1,509	101
---	---	-----	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 4 Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 4.2 Appuyer l'Augmentation et diversification de la production locale des biens et services porteurs

Sous-activité 4.2.2 Organisation de visites d'échange

Indicateur sous-activité Nombre de visites d'échange réalisées

Responsable de Activités Economiques

4	4	100	2,000	1,875	94
---	---	-----	-------	-------	----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 4.2 Appuyer l'Augmentation et diversification de la production locale des biens et services porteurs

Sous-activité 4.2.3 Appui à la promotion de filières porteuses

Indicateur sous-activité Nombre de filières promues

Responsable de Activités Economiques

2	3	150	10,000	17,403	174
---	---	-----	--------	--------	-----

Explication Une filière en plus, Haricot, est appuyée sur demande du CCSC de Bois Poux

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 4 Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 4.2 Appuyer l'Augmentation et diversification de la production locale des biens et services porteurs

Sous-activité 4.2.4 Appui aux porteurs d'initiatives productives (entrepreneuriat local)

Indicateur sous-activité Nombre d'initiatives porteuses appuyées

Responsable de Activités Economiques

4	8	200	100,000	157,599	158
---	---	-----	---------	---------	-----

Explication dans le cadre de l'appui aux fonctionnalités des investissements, 3 anciennes initiatives ont pu bénéficier également d'une assistance technique et financière du projet

Action corrective S/O

Activité 4.2 Appuyer l'Augmentation et diversification de la production locale des biens et services porteurs

Sous-activité 4.2.5 Renforcement des institutions financières locales (identification de nouveaux produits et services, recouvrement de fonds)

Indicateur sous-activité Nombre d'IMF concernées par le diagnostic actualisé

Responsable de Activités Economiques

2	2	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Total			199,500	296,547	149
--------------	--	--	----------------	----------------	------------

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 5 Les meilleures pratiques et leçons apprises du projet sont documentées et diffusées

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 5.1 Appuyer la Systématisation, diffusion et utilisation des meilleures pratiques et leçons apprises du projet par les partenaires de développements

Sous-activité 5.1.1 Production et diffusion de bulletins

Indicateur sous-activité Nombre de bulletins produits

Responsable de CAP

2	2	100	1,400	1,395	100
---	---	-----	-------	-------	-----

Explication S/O

Action corrective S/O

Activité 5.1 Appuyer la Systématisation, diffusion et utilisation des meilleures pratiques et leçons apprises du projet par les partenaires de développements

Sous-activité 5.1.2 Participation à des ateliers, colloques de restitution /capitalisation sur le développement local

Indicateur sous-activité Nombre d'ateliers participés

Responsable de CAP

6	7	116.67	15,250	16,948	111
---	---	--------	--------	--------	-----

Explication Ateliers nationaux et internationaux plus coûteux que prévu

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 5 Les meilleures pratiques et leçons apprises du projet sont documentées et diffusées

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 5.1 Appuyer la Systématisation, diffusion et utilisation des meilleures pratiques et leçons apprises du projet par les partenaires de développement

Sous-activité 5.1.3 Contribution au fonctionnement de la TRC du Nord Est

Indicateur sous-activité Nombre de TRC appuyés

Responsable de CAP

4	6	150	200	123	62
---	---	-----	-----	-----	----

Explication D'autres partenaires (MINUSTAH,...) supportent les TRC ainsique les Tables sectorilles Agricoles et environnement

Action corrective S/O

Activité 5.1 Appuyer la Systématisation, diffusion et utilisation des meilleures pratiques et leçons apprises du projet par les partenaires de développement

Sous-activité 5.1.4 Organisation de la rencontre tripartite

Indicateur sous-activité Nombre de réunion tripartite tenue

Responsable de CAP

1	1	100	250	245	98
---	---	-----	-----	-----	----

Explication Tripartite (Comité Conjoint) tenue à Port au Prince avec participation de moins de cadres que prévus, donc moins coûteuse

Action corrective S/O

Total			17,100	18,711	109
--------------	--	--	---------------	---------------	------------

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 6 Gestion administrative du projet axée sur les resultats

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%

Activité 6.1 Appuyer l'Administration et la gestion

Sous-activité 6.1.1 Support administratif et coordination technique

Indicateur sous-activité Pourcentage du budget utilisé

Responsable de CAP

4	3	75	382,258	402,619	105
---	---	----	---------	---------	-----

Explication Augmentation des salaires plus élevée que prévue

Action corrective S/O

Activité 6.1 Appuyer l'Administration et la gestion

Sous-activité 6.1.2 Appui logistique et technique à l'équipe de projet

Indicateur sous-activité Pourcentage du budget utilisé

Responsable de CAP

6.23	6.08	97.59	63,500	68,783	108
------	------	-------	--------	--------	-----

Explication Les moyens logistiques mobilisés sont plus élevés que prévus avec l'arrivé de nouveaux cadres affectés à Sainte Suzanne

Action corrective S/O

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 6 Gestion administrative du projet axée sur les résultats

	Cibles d'exécution			Budget		
	Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%
Activité 6.1 Appuyer l'Administration et la gestion						
Sous-activité 6.1.3 Appui au Bureau de Chargé de Programme FENU au PNUD						
Indicateur sous-activité Pourcentage du Budget						
Responsable de	CAP					
	5.88	6	102.04	60,000	60,000	100
Explication Les opérations se poursuivent comme prévu						
Action corrective S/O						
Activité 6.1 Appuyer l'Administration et la gestion						
Sous-activité 6.1.4 Appui logistique à la DDMPCE/NE						
Indicateur sous-activité Pourcentage du Budget						
Responsable de	CAP					
	1	0.12	12	2,000	1,245	62
Explication La DD/MPCENE reçoit un appui plus important que prévue du MPCE						
Action corrective S/O						

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.1 Rapport de progrès trimestriel - 31-Dec-2008

Produit 6 Gestion administrative du projet axée sur les résultats

	Cibles d'exécution			Budget		
	Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%
Activité 6.1 Appuyer l'Administration et la gestion						
Sous-activité 6.1.5 Frais administratif FENU						
Indicateur sous-activité	N/A					
Responsable de	CAP					
	0	0	0	20,000	20,000	100
Explication	S/O					
Action corrective	S/O					
Activité 6.1 Appuyer l'Administration et la gestion						
Sous-activité 6.1.6 Mission PNUD/ FENU						
Indicateur sous-activité	Nombre de mission					
Responsable de	CAP et Chargé programme					
	2	1	50	4,000	4,304	108
Explication	S/O					
Action corrective	S/O					
Total				531,758	556,950	105

3. Bilan 2008 selon l'approche de gestion axée sur les résultats.

3.1 Processus de planification

Sur la base des résultats du bilan annuel participatif tenu en fin d'année 2007 dans chacune des 22 collectivités locales des 8 communes de la ZIP et tenant compte à la fois des priorités définies pour 2008, des capacités de chaque collectivité à dégager des fonds d'entretien et finalement du budget FIC/FE disponible, le Comité Consultatif de Gestion des Fonds a procédé à la répartition indiquée ci-dessous. Les décaissements ont été effectués comme arrêtés.


Tableau # 2

REPARTITION FIC-FE PAR COMMUNES

		Montant en Gdes
CARICE	4.4 %	778,000.00
CAPOTILLE	20.9 %	3,661,467.00
MOMBIN CROCHU	9.9 %	1,740,268.60
MONT ORGANISE	23.0 %	4,027,881.00
OUANAMINTHE	12.4 %	2,170,518.16
PERCHES	16.0 %	2,807,157.80
VALLIERES	11.4 %	1,988,067.80
STE SUZANNE	0.7 %	117,632.60
FORT-LIBERTE	1.2 %	218,750.00
		17,509,742.96

Les résultats fournis par le MIS indiquent un taux de réalisation proche de 100 %. Les CT ont pu ainsi améliorer leur capacité de planification et d'exécution, investir dans les infrastructures de services et dans les activités génératrices de revenus (AGR). De manière exceptionnelle, le projet a du répondre à la requête urgente présentée par un quartier pauvre et densément peuplé (Cite Max) de Fort Liberté qui faisait face à une pénurie cruciale d'eau potable pendant plus de six mois. A noter que Fort Liberté est le chef-lieu du Département du Nord-Est, lieu où se trouve le bureau principal du projet mais non inclus dans la ZIP. Le graphique qui suit permet de visualiser la tranche allouée à chaque commune.

GRAPHIQUE # 1

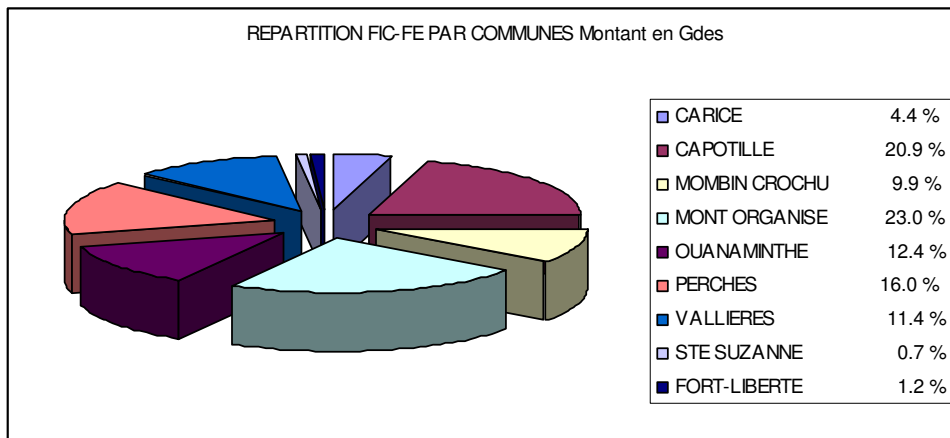

3.2 Fonds d'investissement communal et Fonds environnemental par commune

Le tableau # 3 indique les microprojets d'investissements socio collectifs et d'activités génératrices de revenus priorités par les collectivités de commune et de section communale et dont la mise en œuvre a permis d'améliorer l'offre de services socioéconomiques de la ZIP au bénéfice des populations qui y résident.

Tableau # 3
REPARTITION FIC/FE PAR COMMUNE - ANNEE 2008

COMMUNE	BUDGET EN GDES	DECAISSEMENT
CARICE		
Assainissement rues du bourg de Carice (2e Phase)	195,000.00	195,000.00
Appui à la production d'igname à Bois Gamel	63,000.00	63,000.00
Unité de transformation Canne à sucre à Bois Gamel	520,000.00	520,000.00
SUB-TOTAL	778,000.00	778,000.00
CAPOTILLE		
Signalisation des rues du bourg	120,248.00	120,248.00
Equipement du Centre Ménager	339,805.00	339,805.00
Construction local Radio communautaire	468,980.00	468,980.00
Assainissement des rues du bourg Capotille (2e)	800,000.00	800,000.00
Réhabilitation Petite Ecole Communautaire	52,900.00	52,900.00
Réhabilitation Ecole Communautaire Ch Péralte	50,000.00	50,000.00
Unité de transformation d'arachide (Welch)	630,000.00	630,000.00
Construction d'un dispensaire a Lamine	1,199,534.00	1,199,534.00
SUB-TOTAL	3, 661,467.00	3, 661,467.00

MONT ORGANISE		
Achèvement place publique Mont-Organise	300,000.00	300,000.00
Unité transformation de café	600,000.00	600,000.00
Agriculture intégrée à Lapierre	1,400,000.00	1,400,000.00
Semences améliorées, pois, maïs, igname, légumes	499,125.00	499,125.00
Petit matériel Ecole Nationale Bois Poux	49,435.00	49,435.00
Centre ménager à Lacuève (achèvement)	350,000.00	350,000.00
Extension production igname à Savanette	90,000.00	90,000.00
Renforcement cassaverie Goden	392,566.00	392,566.00
Restauration et équipement BASEC	58,500.00	58,500.00
Appui au redémarrage centre stockage Savanette	255,405.00	255,405.00
Culture maraichère Lacroix	32,850.00	32,850.00
SUB-TOTAL	4, 027,881.00	4, 027,881.00
OUANAMINTHE		
Aménagement du marché Ouanaminthe	375,000.00	375,000.00
Réhabilitation du BASEC Gens de Nantes	130,000.00	130,000.00
Appui redémarrage centre stockage Gens de Nante	113,895.00	113,895.00
Extension du dispensaire Savanne Longue	260,119.51	260,119.51
Installation 3 pompes manuelles Savanne Longue	300,000.00	300,000.00
Installation moulin mamba a Savanne Longue	453,620.25	453,620.25
Appui redémarrage centre de stockage Savanne L	112,150.00	112,150.00
Achèvement du dispensaire Savanne au Lait	425,734.00	425,734.00
SUB-TOTAL	2, 170,518.76	2, 170,518.76
PERCHES		
Moulin céréales aux Perches	1,000,000.00	1,000,000.00

Aménagement Bureau Mairie	48,918.00	48,918.00
Piste rurale Haut des Perches	390,500.00	390,500.00
Valorisation Petits Périmètres Irrigués à Gaston	1,010,378.00	1,010,378.00
Conservation intégrée de sols a Bas des Perches	357,361.80	357,361.80
SUB-TOTAL	2, 807,157.80	2, 807,157.80
VALLIERES		
Achèvement complexe administratif Vallieres	848,384.80	848,384.80
Controle scolyte dans le café (achèvement)	245,712.00	245,712.00
Réhabilitation Trois Palmistes/Vyé Baryè (fin)	43,921.00	43,921.00
Conservation intégrée de sols A Trois Palmistes	500,050.00	500,050.00
Achèvement percée Corosse/Mombin	350,000.00	350,000.00
SUB-TOTAL	1, 988,067.80	1, 988,067.80
MOMBIN CROCHU		
Construction complexe Administratif Mombin Crochu	1, 200,000.00	1, 200,000.00
Unité de transformation de maïs a Sans Souci	340,660.40	340,660.40
Réhabilitation système eau potable Nan Sylvestre	42,178.80	42,178.80
Réhabilitation système eau potable Logate	157,429.40	157,429.40
SUB-TOTAL	1, 740,268.60	1, 740,268.60
STE SUZANNE		
Achèvement complexe administratif Ste Suzanne	117,632.60	117,632.60
SUB-TOTAL	117,632.60	117,632.60

FORT-LIBERTE		
Extension eau potable à Cité Max	200,000.00	200,000.00
Forage puits pour bassin piscicole APSJ	18,750.00	18,750.00
SUB-TOTAL	218,750.00	218,750.00
TOTAL GENERAL	17, 509,743.56	17, 509,743.56

3.3 Répartition des investissements par secteur


Le tableau # 4 montre la répartition optimale des fonds par secteur en fonction des besoins priorités et des ressources disponibles. Si les investissements en infrastructures occupent toujours une place prépondérante (50,7 %) dans le choix des populations locales en raison du déficit des services collectifs de base dans la ZIP, il est néanmoins intéressant de noter le virage progressif vers les AGR au fur et à mesure que les besoins en services sont comblés.

Tableau # 4

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR		
		MONTANT EN GDES
AGRICULTURE	19.2 %	3,359,815.00
AGROINDUSTRIE	22.5 %	3,936,846.65
INFRASTRUCTURE SOCIALE	25.3 %	4,422,135.71
INFRASTRUCTURE ADMINISTRATIVE	25.4 %	4,452,084.10
ENVIRONNEMENT	4.9 %	857,411.80
COMMERCE	2.7 %	481,450.00
TOTAL		17,509,743.26

Le graphique en anneau permet de mieux visualiser l'équilibre qui se profile entre le financement d'investissements en infrastructures au demeurant nécessaire et le développement d'initiatives économiques comme éléments fondateurs du développement local par son apport à la création de richesse et de potentialité fiscale.

GRAPHIQUE # 2

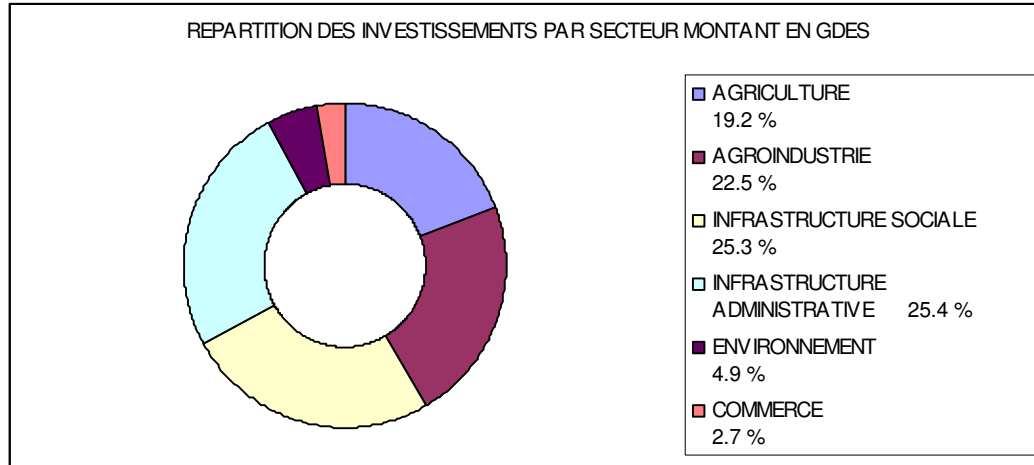

Les tableaux # 5 à # 10 regroupent les 47 microprojets priorités selon cinq grands secteurs d'investissements : infrastructures administratives, infrastructures sociales, activités de production agricole, activités de transformation de produits agricoles, activités de valorisation environnementale et activités de commerce.

Tableau # 5

MICROPROJET INFRASTRUCTURE ADMINISTIVES	MONTANT EN GDES
Signalisation des rues du bourg Capotille	120,248.00
Construction local Radio communautaire Capotille	468,980.00
Construction complexe Administratif Mombin Crochu	1, 200,000.00
Achèvement place publique Mont Organisé	300,000.00
Restauration et équipement BASEC	58,500.00
Aménagement du marché Ouanaminthe	375,000.00
Réhabilitation du BASEC Gens de Nantes	130,000.00
Aménagement Bureau Mairie	48,918.00
Piste rurale Haut des Perches	390,500.00
Achèvement complexe administratif Vallieres	848,384.80
Réhabilitation Trois Palmistes/Vyé Baryè (fin)	43,921.00
Achèvement percée Corosse/Mombin	350,000.00
Achèvement complexe administratif Ste Suzanne	117,632.60
TOTAL (13 microprojets)	4, 452,084.40

Dans la ZIP les infrastructures administratives, symboles représentatifs de la Gouvernance Locale qui font cruellement défaut dans presque tous les autres départements géographiques du pays sont actuellement présentes et font la fierté des citoyens. Le conseil municipal de chacune des 8 communes dispose d'un cadre administratif approprié pour l'exercice de ses fonctions. Toutes les réunions d'importance se tiennent dans la grande salle réservée pour les séances de l'Assemblée Municipale. Les administrés fréquentent les complexes administratifs pour l'obtention des actes/certificats administratifs dont ils ont besoin pour remplir certaines formalités légales.

Tableau # 6

MICROPROJETS INFRASTRUCTURE	MONTANT EN GDES
-----------------------------	-----------------

SOCIALE	
Assainissement rues Carice (Fin 2e Phase)	195,000.00
Equiperment du Centre Ménager	339,805.00
Assainissement des rues Capotille (2e phase)	800,000.00
Réhabilitation Petite Ecole Communautaire	52,900.00
Réhabilitation Ecole Communautaire Ch Péralte	50,000.00
Construction d'un dispensaire a Lamine	1, 199,534.00
Extension du dispensaire Savanne Longue	260,119.51
Achèvement du dispensaire Savanne au Lait	425,734.00
Réhabilitation système eau potable Nan Sylvestre	42,178.80
Réhabilitation système eau potable Logate	157,429.40
Petit matériel Ecole Nationale Bois Poux	49,435.00
Centre ménager à Lacuève (achèvement)	350,000.00
Extension eau potable à Cité Max	200,000.00
Installation 3 pompes manuelles Savanne Longue	300,000.00
TOTAL (14 microprojets)	4, 422,135.71

La desserte des populations de la ZIP en services de base s'est sensiblement améliorée grâce à la mise en œuvre de ces 14 microprojets. De l'eau potable sur une base régulière est fournie à plus de 3000 familles de 6 personnes en moyenne. Des premiers soins sont offerts aux nourrissons, aux femmes enceintes et aux personnes âgées dans les trois nouveaux dispensaires qui remplacent les points de santé sous les arbres où l'on ne faisait que la vaccination et la pesée de tous petits. Quatre vingt deux jeunes filles apprennent actuellement les techniques modernes de couture, de cuisine et de pâtisserie dans les deux centres ménagers réhabilités et équipés de matériels industriels. Elles sont des candidates potentielles pour la zone franche CODEVI installée à Ouanaminthe sur la bande frontalière avec la République Dominicaine et qui recherche des ouvrières qualifiées pour la fabrication de vêtements et sous-vêtements (jeans, t-shirts, soutien gorge...) pour l'exportation.

Tableau # 7

MICROPROJETS AGRICOLES	MONTANT EN GDES
Appui à la production d'igname a B Gamel	63,000.00
Agriculture intégrée à Lapierre	1, 400,000.00
Extension production igname à Savanette	90,000.00
Culture maraîchère Lacroix	32,850.00
Semences améliorées, pois, maïs, igname, légumes	499,125.00
Valorisation Petits Périmètres Irrigués à Gaston	1, 010,378.00
Contrôle scolyte dans le café (achèvement)	245,712.00
Forage puits pour bassin piscicole APSJ	18,750.00
TOTAL (8 microprojets)	3, 359,815.00

Certaines techniques culturales introduites par le projet commencent à démontrer leur efficacité et leur intérêt économique. C'est le cas de l'igname, des haricots noirs et des cultures maraîchères qui suscitent une forte demande au sein des collectivités. Deux périmètres agricoles (Gaston 7 ha 50 et Lapierre 30 ha) font actuellement l'objet d'une mise en valeur intégrée (irrigation, diversification agricole, élevage animal ou piscicole, aménagement antiérosif). L'évolution des productions en cours laisse présager des récoltes de loin supérieures aux attentes. Un puits foré au projet piscicole de Fort Liberté a permis d'éviter la perte d'une vingtaine de bassins de poissons vu qu'une sécheresse prolongée de plus de 5 mois avait réduit considérablement le débit de la rivière qui les alimente en eau.

Tableau # 8

MICROPROJETS AGROINDUSTRIELS	MONTANTS EN GDES
Unité de transformation Canne à sucre B Gamel	520,000.00
Unité de transformation d'arachide (Welch)	630,000.00
Unité transformation de café	600,000.00
Unité de transformation de maïs a Sans Souci	340,660.40
Moulin céréales aux Perches	1, 000,000.00
Installation moulin mamba Savanne Longue	453,620.25
Renforcement cassaverie Goden	392,566.00
TOTAL (7 microprojets)	3, 936,846.65

L'option pour des activités économiques plus rentables se confirme avec le choix des 7 microprojets de transformation de produits agricoles par les agents économiques de 7 collectivités avec une affirmation du poids grandissant des femmes dans les négociations sur le choix des priorités de l'année. Cinq des 7 projets sont portés et mis en œuvre par une participation majoritaire des femmes dans les comités de gestion.

Tableau # 9

MICROPROJET ENVIRONNEMENT	MONTANT EN GDES
Conservation intégrée de sols à Bas des Perches	357,361.80
Conservation intégrée de sols A Trois Palmistes	500,050.00
TOTAL (2)	857,411.80

L'Unité Environnementale a été reconstituée au milieu de l'année 2008 suite à la démission de deux cadres pour des raisons de santé. Seulement deux projets ont démarré au troisième trimestre dans les bassins versants de Perches et de Vallières pour faire face aux problèmes de dégradation accélérée des terres, de perte de leur fertilité, d'ensablement des lagons, de diminution du débit des sources et de la couverture végétale avec leur incidence négative sur la vie des populations résidentes. Il s'agit de protéger environ 250 hectares de terres par des structures antiérosives et des aménagements parcellaires, de traiter 13 kilomètres de ravines, de produire 38,000 plantules, de former 60 planteurs sur les techniques de conservation des sols et de gestion de pépinières et d'ériger 4000 mètres cubes de seuils en pierres sèches et 3000 mètres linéaires de clayonnage.

Tableau # 10

MICROPROJET COMMERCE	MONTANT EN GDES
Appui au redémarrage centre stockage Savanette	255,405.00
Appui redémarrage centre stockage Gens de Nante	113,895.00
Appui redémarrage centre de stockage Savanne L.	112,150.00
TOTAL (3)	481,450.00

Une contribution sous la forme de subvention et d'appui technique au redémarrage de trois centres de stockage des associations de femmes des collectivités de Section Communale de Savanette (RFS 200 membres actifs), Gens de Nantes (MFTKJ 80 membres actifs) et Savanne Longue (AFS 100 membres actifs) a facilité un nouveau départ de ces centres. En effet, suite à des sessions de formation offertes par le projet, environ 30% des membres maîtrisent des techniques améliorées de stockage des semences, des stratégies de commercialisation des produits agricoles et de notions de base en gestion de petit projet et comptabilité. Les centres sont équipés de palettes de 15cm de hauteur, 100cm de largeur et 200cm de longueur ainsi que de prélatés de 4m * 4m qui permettent de mieux conserver les produits stockés.

L'exercice de suivi mené auprès de ces trois centres de stockage a noté que les comités de gestion ont acheté trois ânes, un pour chacun des centres, lesquels ont été utilisés au transport des achats de produits/semences pour un montant combiné de 377,500 gourdes. Des marges bénéficiaires nettes de 30 % sont attendues.

3.5 Incidence du flux monétaire de l'investissement FIC/FE


Sur les 17, 509,743.26 gourdes des fonds FIC et FE investies dans la ZIP, un volume important soit 9, 663,335.41 gourdes ont été injectées dans l'économie régionale et locale sous forme d'achats de matériaux et de services de main d'œuvre. Le tableau # décrit la répartition de ce flux financier selon les intrants utilisés pour réaliser les travaux de construction rentrant dans l'exécution des différents microprojets d'infrastructures économiques et sociales.

Tableau # 11

REPARTITION DES DEPENSES CONSTRUCTION		MONTANT EN GDES
MATERIAUX LOCAUX	23.3 %	2,248,108.26
MATERIAUX IMPORTEES	42.6 %	4,115,952.31
TRANSPORT MATERIAUX	4.8 %	460,650.38
MAIN D'OEUVRE LOCALE	28.2 %	2,728,082.21
MAIN D'OEUVRE EXTERNE	1.1 %	110,542.25
TOTAL		9,663,335.41

Une fois de plus, le graphique en barres permet de mieux visionner les postes de dépenses ayant absorbé les parts les plus importantes du flux monétaire d'investissement irriguant l'économie locale. Les effets significatifs méritent d'être soulignés. Si les matériaux importés ont absorbé 42,6 % des dépenses soit 4, 115,952.31 gourdes et ont profité aux gros commerçants régionaux établis dans la ville frontalière de Ouanaminthe, en revanche les postes matériaux locaux (sable, roche, gravier, eau) et main d'œuvre locale qui forment à eux deux 51, 5 % du montant total, soit 4, 976,190.47, constituent des revenus importants pour des petits entrepreneurs et des travailleurs. Environ 218,000 personnes/jours de travail ont été créés au cours de l'année 2008 dans la seule ZIP par les Fonds FIC /FE. Etant donné que les revenus sont taxés à 10 % en Haïti, un système d'imposition efficace récupérerait près d'un demi million de gourdes d'impôts.

GRAPHIQUE # 3

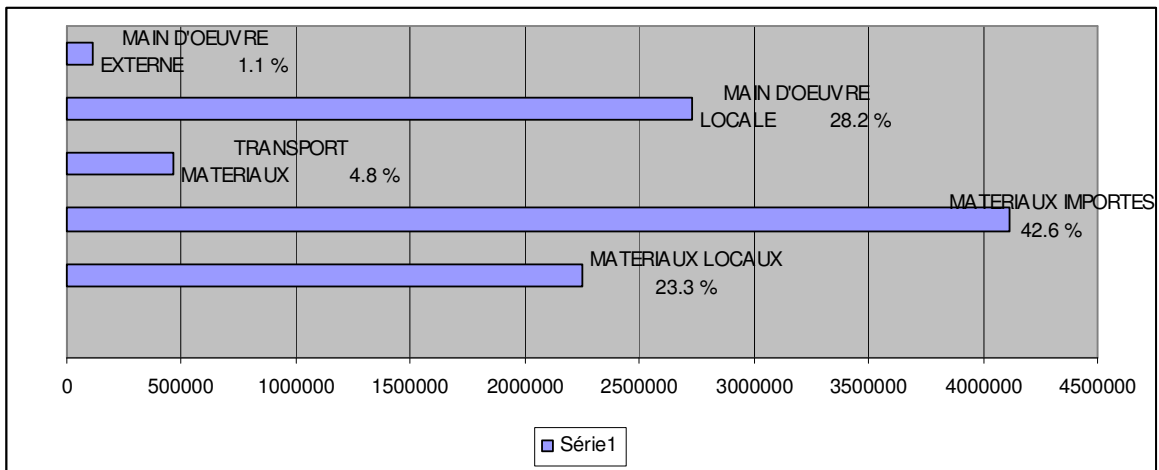

3.6 Aspect genre

Au cours de l'année 2008, plusieurs réunions ont été organisées avec les femmes membres de CCC et CCSC des huit communes et sections communales sur les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes. A noter que la représentativité des femmes dans ces structures locales de concertation varie entre 40 et 50 %. Au sein des comités exécutifs de ces structures, les femmes siègent à hauteur de 30 %. Elles sont très actives dans l'identification et au choix de projets pouvant contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur les 17, 509,743.26 gourdes allouées par le FENU pour l'année, une part significative d'environ (20%), a été investie dans dix projets exclusivement mis en œuvre par et pour les femmes. De plus, les femmes représentent 57% des membres du comité de gestion des 47 projets réalisés et quatre (4) d'entre elles remplissent les fonctions de présidente.

Si l'on ajoute les deux projets financés par le FAES, le montant des investissements au bénéfice des femmes dans la ZIP s'élève à 6,598,627 gourdes.

TABLEAU # 12 : Investissements au profit des femmes par localités

Titre du projet	Association	Localités	Financement	Montant en GDES
Traitement de ravine et agroforesterie	Oganizasyon Fanm Maten Jannant	Gens de Nantes	FAES	1, 852,875
Introduction d'un moulin de riz à Décou	Mouvman Fanm Tèt Kole Jannant (MFRKJ)	Gens de Nantes (Décou)	FAES	1, 050,008
Centre Ménager de Capotille	CCC	Capotille	AGLNE	339,805
Centre Ménager de Lacuève	CCSC	Savanette	AGLNE	350,000
Unité de Transformation D'arachide à Welch	Rasanbleman fanm vayan Wèlch (RFVW)	Capotille	AGLNE	630,000
Unité de Transformation de Céréales	Oganizasyon Fanm Vayan Perches (OFVP)	Perches	AGLNE	1, 000,000
Unité de Transformation de maïs à Sans Souci	Mouvman pou Devlopman Fanm Tè sale (MODEFAT)	Mombin Crochu	AGLNE	840,869
Unité de Transformation café à Mont organisé	Asosyasyon Fanm Devwe Mont-Oganize (AFDMO)	Mont -Organisé	AGLNE	600,000
Unité de Transformation D'arachide Savane Longue.		Savanne Longue	AGLNE	453,620
Appui au redémarrage centre stockage Savanette		Savanette	AGLNE	255,405
Appui redémarrage centre stockage Gens de Nante		Gens de nantes	AGLNE	113,895
Appui redémarrage centre de stockage Savanne L.		Savanne Longue	AGLNE	112,150
TOTAL				6, 598,627

En outre plusieurs sessions de formation ciblées ont amélioré le savoir faire de 867 femmes. Pour preuve :

- ✚ **81** femmes issues des 3 groupements (AFS, RFS, MFTKJ) formées en : Technique de stockage des semences, Commercialisation des produits agricoles, Gestion de petit projet et comptabilité.
- ✚ **18 F** sur 40 participants-es de 2 sections communales (Savane Longue et Savanette) formées en : techniques de plantation légumes, de préparation de sol, des insecticides naturels et engrais naturels solides.
- ✚ **39 F** sur 129 participants-es venant de Bas des Perches, Trois Palmistes, Bois de Laurence, Gens de Nantes et Mombin Crochu formées en techniques de protection de l'environnement.
- ✚ **15 F** sur 32 participants-es venant de Mombin Crochu formées en leadership communautaire, gestion de groupes et conflits, résolution problèmes.
- ✚ **17 F** sur 35 participants-es venant de Gens de Nantes formées en techniques d'élevage amélioré.
- ✚ **21 F** sur 64 participants-es venant de Corosse, Bois de Laurence, Mombin Crochu, Sans Souci, Bas des Perches, Haut des Perches, Perches, Trois Palmistes formées sur les Outils de Gestion financière.
- ✚ **26 F** sur un total de 36 superviseurs (seuses) et moniteurs (trices) maîtrisent la nouvelle méthode télévisuelle d'alphabétisation dispensée par la Secrétairerie d'Etat à l'Alphabétisation (SEA) et ont assuré l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul à 650 illettrés dans 13 centres alpha.
- ✚ **527 F** de plus peuvent désormais lire, comprendre, écrire en créole et réaliser des calculs simples dans leurs activités quotidiennes.

3.7 Renforcement des capacités

Tableau consolidé des activités de renforcement des capacités

Thèmes dispensés en 2008		Nombre de séances	Nombre de Bénéficiaires		
			Total	Hommes	Femmes
Environnement	Techniques de Conservation des sols, pépinières et Plantation d'arbres	5 (Pour planteurs, CCSC de 5 sections communales)	156	131	25
	Intensification Culture Maraîchère (Préparation de sol, Compostage à chaud, Control biologique des insectes, préparation d'insecticides et d'engrais naturels)	3 (Planteurs, CCSC de 3 sections communales d'intervention du projet AGL-NE)	64	32	32
	Technique de gestion et de comptabilité microprojets	5 (Pour 5 CLE de microprojets environnement)	22	16	6
	Education Environnementale	2 (Pour professeurs de 2 communes d'intervention)	16	15	1
	Sous -Total	18	258	194	64
Développement Local	Fonctionnalité des Mairies	6 (Pour 6 Mairies des 8 communes d'intervention)	21	19	2
	Droit et Devoir & application loi 4 avril	1 (Pour 6 CASEC de 7 des 8 communes d'intervention)	47	46	1
	Gestion groupe, Gestion conflit, résolution Problème	4 (Pour CCC/CCSC, et Mairies et CASEC)	125	87	38
	Elaboration et gestion Projet	3 (Pour CCC/CCSC, et Mairies et CASEC, OCB)	92	69	23
	Planification participative	8 (CCC/CCSC, Elus locaux, OCB)	105	60	45
	Sous Total	55	390	281	109

Tableau consolidé des activités de renforcement des capacités

Thèmes dispensés 2005-2008		Nombre de séances	Nombre de Bénéficiaires		
			Total	Hommes	Femmes
Suivi participatif local	Maîtrise d'Outils Suivi participatif local :				
	compréhension et appropriation du système de suivi préconisé au sein du projet, Kànva rapò AS, Gid kànva Rapò AS, Fich teknik swivi mikwopwojè, Tablo Objektif ak Rezilta, Kesyonè ankèt lejè pou kolekte enfòmasyon sou benefisyè endividyèl mikwopwojè yanm, Fich teknik kolèk enfòmasyon sou benefisyè endividyèl mikwopwojè anviwònman, Fich sentèz pou kolèk enfòmasyon de baz pou swivi pwojè anviwònman, Fich Diagnostik peryodik Rezilta pwojè anviwònman, Griy kolèk enfòmasyon sou Modil fòmasyon ki reyalize nan CL	3 (Pour Agents-es de suivi)	16	9	7
	Compréhension concept suivi communautaire, CCS : Rôles et responsabilités, Technique d'animation et gestion réunion communautaire, Principes de préparation et gestion rapport de réunion communautaire	3 (Pour CCS, AS, CCC/CCSC, Personnels mairies, OCB)	92	69	23
	Sous Total	6	108	78	30
A	Processus de planification économique				

Thèmes dispensés 2005-2008	Nombre de séances	Nombre de Bénéficiaires		
		Total	Hommes	Femmes
<p>Contexte général : Activités (business) identifiées dans la communauté, Activités marchant le mieux, Type de produit/service qui vend bien/qui ne vend pas bien, type de produit/service qui pourrait marcher</p> <p>Marketing : Type de produit/service que j'aimerais vendre, Raisons de choix, Clientèle (qualité/ quantité)</p> <p>Production : Procédés de fabrication des produits, Intrants, Sources des Matières premières, Utilisation des sous-produits</p> <p>Gestion : Types de Personnel, Outils de gestion</p> <p>Finance : Fonds de démarrage, Calcul de rentabilité, Notion de profit</p> <p>Leadership : Le leader, Capacités pour être leader, Qualités d'un vrai leader</p>	1 (Pour Agents-es de suivi, OCB)	26	10	16
Gestion de projets économiques et Techniques de production du haricot	1(Pour Planteurs de la section communale Bois Poux)	38	19	19

Tableau consolidé des activités de renforcement des capacités

	Thèmes dispensés 2005-2008	Nombre de séances	Nombre de Bénéficiaires		
			Total	Hommes	Femmes
Activités Economiques	Gestion de projets/Activités économiques :				
	Définition du projet, Cycle d'un projet, Calendrier et Chronogramme d'activités, Budgétisation, Participation / Contribution locale, Rôles des membres du CLE, du CASEC, de l'ASEC, du CCSC, Différents types de gestion, Gestion financière , Différents outils de gestion(Contrat,Demande et Autorisation de décaissement d'argent, Pro format, Reçu, Perl, Cahier de caisse), Présentation d'un rapport financier, Définition de quelques thèmes importants (Activité économique, Profit, Déficit, Intérêt, Amortissement, Bilan, Actif, Passif, Compte résultat), Calcul rentabilité économique des activités, Compte de résultat	10 (Pour CCSC, CASEC, ASEC, OCB = RFVW, AFS, MODEFAT, APMG)	62	31	31
		1 (Pour CCC, Mairies, OCB = AFDEMO)	6	3	3
		1 (Pour OCB = NKL)	17	11	6
	Gestion centre stockage : Définition du concept Stockage des semences, Importance d'un Centre de stockage, Fonctionnalité d'un Centre de stockage, Eléments importants pour un stockage réussi, Informations à placer sur les récipients contenant les grains,Quelques principes à respecter pour un stockage	4 (Pour OCB : MFTKJ, RFS, AFS)	35	2	33

	réussi, Destination des grains stockés, Test de germination, Comment diminuer les pertes post récoltes en améliorant la qualité de stockage				
	Contrôle de qualité: Culture de l'arachide, Procédés de fabrication du beurre d'arachide (Décorticage, Grillage, Blanchiment, Blanchiment à sec, Blanchiment à eau, Broyage, Emballage), Importance de l'Arachide/Beurre d'arachide, Avantage (économie, Santé, Précaution à prendre par la consommation d'arachide), Désavantage		45	10	35
	Gestion d'activités économiques	3 (Pour OCB = NKL, AFS, MTKFJ)	28	12	16
	Sous Total	22	257	98	159

Tableau consolidé des activités de renforcement des capacités

Thèmes dispensés 2005-2008		Nombre de séances	Nombre de Bénéficiaires			
			Total	Hommes	Femmes	
Infrastructure	Maîtrise d'ouvrage local :					
	Méthodes de planification et de gestion de chantiers par les chefs d'équipes et superviseurs d'exécution de microprojets	1 (pour Chefs d'équipes & superviseurs d'exécution de microprojets)	6	5	1	
	Technique de gestion comptable et financière de microprojets	13 (pour CLE de microprojets)	127	82	45	
	Système Numérotage des maisons - Taxations	1 (pour membres CLE et CCC)	15	9	6	
	Sous - Total	15	148	96	52	
Genre et Développement	Sensibilisation en « Genre »	6 (pour membres OCB et CCC/CCSC)	53	13	40	
	« Genre et Développement VS Développement durable»	3 (pour membres OCB et CCC)	80	60	20	
	Promotion du « leadership féminin »	12 (Pour membres CCC/CCSC, CLE et OCB)	63	0	63	
	Harmonisation de concepts, Importance EFH dans le Développement, Stratégie en matière d'EFH	1 (Pour cadres des institutions partenaires)	26	17	9	
	Alphabétisation : Formation d'alphabétiseurs		1 (Pour Membres CCC, CCSC, AS à titre de Moniteurs, superviseurs)	36	10	26
		Initiale (Technique de lecture et d'écriture)	65 (Pour hommes et femmes de 4 CL)	663	136	527
	Sous -Total	106	921	236	685	
		222	2082	983	1099	

Seulement au cours de l'année 2008, un effectif de 2082 acteurs locaux ont reçu de la formation pratique dans des domaines qui les habilitent à mieux vivre ensemble, à maîtriser de nouvelles techniques de production respectueuses de l'environnement et à être capable de gérer avec efficacité leurs activités économiques.

3.8 Volet environnement

Au cours du deuxième semestre de l'année 2008, les deux collectivités de Trois palmistes (Vallières) et de Bas des Perches (Perches) sont appuyées dans l'élaboration de deux projets de conservation intégrée des sols. Actuellement, ces deux projets sont en cours d'exécution. Ils permettront la récupération de 225 hectares de terres par des structures antiérosives et la formation de 60 planteurs sur les techniques de conservation intégrée de sols.

Les principales activités menées sont les suivantes

3.8.1 Formation des planteurs sur les techniques de conservation des sols

Durant la période allant du 16 au 19 septembre 2008, l'équipe environnementale a réalisé deux (2) sessions de formation respectivement à Trois palmistes et à Bas des Perches sur les techniques de conservation intégrée des sols, la mise en place et gestion de pépinières et la plantation d'arbres. Cette formation vise à renforcer la capacité des planteurs sur les techniques de conservation des sols tout en leur dotant d'outils de base leur permettant de mieux protéger leurs parcelles. Les séances de formation se sont déroulées sur deux (2) aspects (théorique et pratique) suivant une approche participative et active. Un document de support a été remis à chaque participant afin qu'il puisse approfondir les différents thèmes traités au cours de la formation. Ainsi, 75 planteurs dont 10 femmes ont été formés.

Les activités ont déjà commencé et environ trente (30) hectares de terres sont protégés par des structures antiérosives (rampes d'ananas, de canne à sucre et d'herbe éléphant).

3.8.2 Intensification de la culture maraîchère

Dans le but de dynamiser la production agricole dans l'aire du projet AGLNE, l'équipe environnementale a pris l'initiative de mettre sur pied un petit projet d'intensification de la culture maraîchère. L'objectif de ce projet est de renforcer la capacité des producteurs de légumes dans les domaines suivants: Préparation de sol pour la production de légumes; Compostage à chaud; Control biologique des insectes; Préparation d'insecticides et d'engrais naturels.

Ainsi, deux (3) sessions de formation de six (6) jours chacune sont réalisées dans les sections communales de Savanette (Mont-Organisé), de Savane Longue (Ouanaminthe) et de Bas des perches (Perches) à l'intention de soixante quatre (64) producteurs de légumes dont trente deux (32) hommes et trente deux (32) femmes. En plus des séances théoriques, ils ont bénéficié des séances pratiques sur le terrain. Une superficie de 5000 mètres carrés est mise en valeur par chacune des collectivités précitées en vue de mettre en pratique les notions apprises, ce qui fait un total de 1.5 hectares de terre emblavés en culture maraîchère. Ces trois (3) collectivités constituent une sorte de pilotage pour ce projet avant de faire l'intensification dans les différentes zones d'intervention du PAGLNE.

3.8.3 Éducation Environnementale

Dans le souci de poursuivre la sensibilisation des jeunes sur les problèmes environnementaux et leurs conséquences, l'équipe du projet de commun accord avec les responsables des Bureaux agricoles communaux (BAC du MARNR) a organisé deux conférences à l'intention des élèves des classes de 5^{ème} et 6^{ème} années fondamentales, des professeurs et des élus locaux de Sainte Suzanne et de Savane Longue. Au cours de ces conférences, quelques 1200 élèves dont 650 filles sont sensibilisés sur la problématique environnementale aux niveaux mondial, national et local. Puis, 2000 plantules d'arbres fruitiers et forestiers sont mis en terre par les écoliers qui s'engagent à contribuer à leur protection et garantir plus de 90 % de réussite

En conclusion, les résultats obtenus sont résumés ci-dessous :

- ✓ Soixante quinze (75) planteurs sont formés en techniques de protection de l'environnement, gestion de pépinières et plantation d'arbres;
- ✓ 64 planteurs sont formés sur la fabrication d'engrais et d'insecticides naturels et sur les techniques de production maraîchère
- ✓ Trente (30) hectares de terres sont aménagés par des structures antiérosives ;
- ✓ Mise en valeur de 1.5 hectares de terres par des cultures maraîchères;
- ✓ Huit cents (1200) élèves dont 650 filles et 550 garçons sont sensibilisés sur la problématique environnementale.
- ✓ Deux mille (2000) plantules d'arbres fruitiers et forestiers sont mis en terre.
- ✓ Les populations sont sensibilisées sur la protection de l'environnement et agissent en vue d'une gestion durable des ressources naturelles ;

3.9 Partenariats

Au cours de l'année 2008, la stratégie de mobilisation de fonds mise en place par le projet a donné des résultats exceptionnels en termes de volume d'investissements ayant financé directement des projets prioritaires dans les PDL des collectivités territoriales et sous forme de cofinancement transitant par les comptes du projet. L'Accord de Partenariat signé avec le FAES en fin 2006 est arrivé à maturité avec le financement direct de l'exécution de 24 projets dont 18 AGR pour un montant total en gourdes équivalant à 2, 343,652.61 dollars américains.

De plus, le MPCE, sur les fonds du Trésor Public à hauteur de 7, 000,000 de gourdes (175,000 \$ US), prend en charge le renforcement du projet par le recrutement de 3 ressources personnes additionnelles devant faciliter l'extension du projet dans la commune de Sainte Suzanne et de ses 6 sections communales.

Se détache de manière particulière, la contribution d'autres agences du système des Nations Unies. Le MOU signé avec le PNUD est une grande première en Haït ; il confirme la subvention de 577,800 dollars américains, en vue de donner plus de visibilité au

projet. La MINUSTAH cofinance pour un montant de 25,000 dollars américains la construction du complexe administratif de Mombin Crochu. Le PAM a également signé un MOU avec le projet et a fourni une contribution de 17 tonnes de produits alimentaires coûtant 14,427 dollars américains qui ont été utilisés pour rétribuer en ration alimentaire durant trois mois une cinquantaine d'ouvriers travaillant dans la réhabilitation et l'extension du petit système d'irrigation du périmètre Gaston d'une superficie de 7,5 ha.

Il est important de signaler l'enthousiasme des bailleurs partenaires à investir dans les communes qui maîtrisent le processus de planification participative et dont les populations font montre d'un bon niveau d'organisation en fonction de leurs intérêts spécifiques. L'existence d'un PDL est un atout majeur car les bailleurs, sensibles à la plaidoirie du projet, ne financent plus de projets à la carte. Le Bureau Régional du FAES Nord/Nord-Est a procédé à la validation des PDL de 6 communes et de 14 sections communales de la ZIP et le Bureau Régional du FAES Centre a validé les PDL de la commune de Mombin Crochu et des sections communales Sans Souci et Bois de Laurence. A date, 3 communes et 9 sections communales ont bénéficié des investissements sociaux et AGR de cette institution de financement national suite à l'Accord de Partenariat signé avec le projet AGLNE.

Le Bureau des affaires Civiles Nord-est de la MINUSTAH qui dispose d'un montant annuel d'environ 400,000 dollars américains pour financer des petits projets à impact rapide (Quick Impact < 15,000 US\$) dans tout le département s'arrange pour cofinancer au moins un projet d'un PDL devant permettre un meilleur impact.

Le PAM, suite aux visites des réalisations effectuées dans le cadre du projet et après échanges et discussions avec le Bureau de la Coordination dans le Nord, a décidé de contribuer dans la mise en œuvre de microprojets de sécurité alimentaire dans la ZIP.

Le PNUD s'est engagé à renforcer les interventions en aménagement rentable des bassins versants par des procédés impliquant la responsabilité des autorités et des populations locales pour une bonne gouvernance de l'environnement.

4. Rapport financier agrégé par produit

Pour l'année 2008, le taux d'exécution budgétaire dépasse de 17 % les montants décaissés comme l'indique le tableau synthèse par produit ci-dessous. Ceci est dû au fait que tout le budget prévu a été utilisé auquel s'est ajoutée la balance restante de l'année 2007. Le rapport financier détaillé est en annexe.

TABLEAU # 14 : Synthèse financière par produit

Produit	Approbation (\$US)	Réalisation	Exécution budgétaire % décaissé	% du total
1. Les collectivités locales maîtrisent le processus de planification participative locale	73,442	73,697	100	6
2. Les collectivités territoriales (communes et sections) ont un accès amélioré aux sources de financement internes et externes	2,600	2,369	91	0
3. Capacité des acteurs locaux à la mise en place et à l'entretien des infrastructures de base renforcée	196,100	242,257	124	20
4. Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles	199,500	296,547	149	25
5. Les meilleures pratiques et leçons apprises du projet sont documentées et diffusées	17,100	18,711	109	2
6. Gestion administrative du projet axée sur les résultats	531,758	556,950	105	47
Total	1, 020,500	1, 190,531	117	100

Source ATLAS et MIS

4.1 Condensé des résultats obtenus par produit

Selon le tableau # 14 ci-dessus, le budget alloué pour atteindre les résultats par produit est complètement utilisé, ce qui sous entend que les cibles prévues ont été atteintes avec les effets induits souhaités. Les résultats obtenus par produits peuvent être résumés comme suit :

Produit 1 : Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale

- Maîtrise de la démarche de planification participative par les acteurs locaux dans les 23 collectivités territoriales accompagnées de la ZIP.
- Une participation plurielle des citoyens au processus de planification avec une forte présence active des femmes (plus de 35 %).

- Mécanismes de consultation, d'échange d'information et de suivi des activités mis en place au sein des structures communales.

Produit 2 : Les collectivités territoriales (communes et sections) ont un accès amélioré aux sources de financement internes et externes

- Des partenariats dynamiques et stratégiques sont développés avec plusieurs partenaires institutionnels au sein des collectivités accompagnées.
- Le volume d'investissement local s'accroît dans les collectivités locales et une part importante (environ 30 %) est injectée dans l'économie du milieu sous forme d'achats de matériaux naturels et de main d'œuvre.
- La livraison de service public local est en croissance dans les collectivités de la ZIP et certains déficits sont en régression.

Produit 3 : Capacité des acteurs locaux à la mise en place et à l'entretien des infrastructures de base renforcée

- Les collectivités locales maîtrisent le processus de maîtrise d'ouvrage.
- Des prévisions budgétaires sont faites par les collectivités pour assumer les coûts récurrents des investissements consentis et attendent d'être validées par le ministère de tutelle.

Produit 4 : Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles

- Le milieu maîtrise de mieux en mieux les questions relatives à la protection de l'environnement et applique les principes de la gestion durable dans leurs activités économiques et socioculturelles.
- Le revenu des groupements de planteurs s'est amélioré au cours de la période.
- Les autorités locales veillent à l'application dans leur juridiction de la réglementation nationale sur la protection des ressources naturelles

Produit 5 : Les meilleures pratiques et leçons apprises du projet sont documentées et diffusées

- Des organisations externes au projet se sont appropriées les démarches et méthodologies mises en œuvre dans le cadre de l'intervention et recourent au besoin à l'expertise technique des agents du milieu formés par le projet au bénéfice d'autres zones.

Produit 6 : Gestion administrative du projet axée sur les résultats

- Le projet a un taux d'atteinte des cibles et d'exécution budgétaire d'au moins 90 %

ANNEXE 1 : Rapport de l'atteinte des cibles par produits

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.2.1 Rapport annuel: Atteinte des cibles / dépenses budgétaires - 31-Dec-2008

	Cibles d'exécution			Budget		
	Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%
Produit	1 1 <u>Les collectivités locales maîtrisent le processus de la planification participative locale</u>					
Indicateur de exécutifs	Pourcentage de femmes engagées au niveau du Comités					
40	31	77.5				
Indicateur de	Nombre de PDL élaborés par les CCC					
7	6	85.71				
Indicateur de suivi	Pourcentage de femmes engagées au niveau des Comités de					
40	35	87.5				
Indicateur de	Pourcentage de femmes engagées au niveau du CCC et du CCSC					
50	34	68				
Indicateur de (communes et sections)	Nombre d'hommes et de femmes participant aux bilans annuels					
1700	0	0				
Indicateur de	Nombre de bilans annuels réalisés					
23	23	100				
Indicateur de	Nombre de budget communaux élaborés					
8	8	100				
Indicateur de	Nombre de PDL élaborés par les CCSC					
23	16	69.57				
Indicateur de	Nombre de bilans communaux annuels accessibles au public					
8	7	87.5				
Indicateur de	Pourcentage de femmes engagées comme agentes de suivi					
50	50	100				
Produit	1			73,442	73,697	100

Produit **22 Les collectivités territoriales (communes et sections) ont un accès amélioré aux sources de financement internes et externes**

Indicateur de comptable	Nombre d'autorités locales respectant les normes de gestion		
72	72	100	

CPR.2.1 Rapport annuel: Atteinte des cibles / dépenses budgétaires - 31-Dec-2008

	Cibles d'exécution			Budget		
	Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%
Indicateur de	Nombre de projets du PIC/PIE cofinancés par le PIP					
4	4	100				
Indicateur de	Nombre de projets du PIC financés par FIC, FE et autres fonds					
30	57	190				
Indicateur de	Pourcentage de fonds interne par rapport aux fonds externes					
10	0	0				
Indicateur de	Pourcentage des membres du CCC qui connaissent les montants alloués sur les FIC/FE communiqués par le maire					
100	100	100				
Indicateur de	Nombre de rencontres tenues par les élus (Maires et CASEC) sur l'utilisation des fonds					
46	46	100				
Indicateur de	Nombre de collectivités territoriales ayant fait l'objet d'audit sur les fonds alloués à travers le projet					
8	2	25				
Indicateur de	Allocation des fonds FENU se réduit progressivement (% par an)					
0	0	0				

Produit	2	2,600	2,369	91
----------------	----------	--------------	--------------	-----------

Produit des **3 3 Capacité des acteurs locaux à la mise en place et à l'entretien des infrastructures de base renforcée**

Indicateur de	Nombre de projets accomplis dans les délais prévus		
23	18	78.26	

Indicateur de **Nombre de projets accomplis avec enveloppes prévues**
23 18 78.26

Indicateur de **Nombre des projets avec fonds d'entretien**
8 0 0

Indicateur de **Nombre de budgets communaux ayant un fonds d'entretien pour les infrastructures de base**
8 0 0

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.2.1 Rapport annuel: Atteinte des cibles / dépenses budgétaires - 31-Dec-2008

Cibles d'exécution			Budget		
Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation	%
Indicateur de satisfaisante	Nombre de microprojets terminés et jugés d'une qualité				
23	18	78.26			
Produit	3		196,100	242,257	124
Produit	<u>44 Les groupements de base sont appuyés dans l'exploitation durable des ressources naturelles</u>				
Indicateur de techniques de conservation du sol	Nombre de planteurs/cultivateurs qui appliquent des nouvelles				
300	114	38			
Indicateur de	Nombre d'hectares aménagés, consolidés et mis en défens				
200	0	0			
Indicateur de génératrices de revenus	Nombre de ménages bénéficiant d'activités agroalimentaires				
80	591	738.75			
Indicateur de gestion durables	Nombres d'encadreurs locaux vulgarisant les techniques de				
80	0	0			
Produit	4		199,500	296,547	149
Produit	<u>55 Les meilleures pratiques et leçons apprises du projet sont documentées et diffusées</u>				
Indicateur de pratiques du projet	Nombre d'actions/décisions au niveau central s'inspirant des				
1	1	100			
Indicateur de s'inspirant des pratiques du projet	Nombre d'actions/décisions au niveau d'autres bailleurs, projets				
1	1	100			
Indicateur de	Nombre de partenaires de développement du département du				

Nord-Est appliquant les leçons apprises

1 1 100

Indicateur de Nombre de rencontres de la table ronde de concertation

4 4 100

Produit 5 17,100 18,711 109

Page3

12/20/2008 1:03:31 PM

Projet HAI/05/C01 - Gouvernance locale dans le Nord-Est

CPR.2.1 Rapport annuel: Atteinte des cibles / dépenses budgétaires - 31-Dec-2008

		Cibles d'exécution		Budget	
	Prévision	Réalisation	%	Approuvé	Réalisation
					%
Produit	6	<u>6 Gestion administrative du projet axée sur les résultats</u>			
Indicateur de	Taux d'atteinte des cibles annuelles de résultats escomptés de				
75%	100	0	0		
Indicateur de	Taux d'exécution budgétaire au moins de 75% en fin d'année				
2008	100	59	59		
Produit	6			531,758	556,950
					105

ANNEXE 2 : Rapport de l'atteinte des cibles par activités

Projet HAI/05/C01 Gouvernance locale dans le Nord-Est
Démarrage 01/01/2005 **Fin** 31/12/2009

CCP.1 Rapport annuel de HAITI **Date de référence** 2008-12-31

1.1 No de CL cibles ayant une capacité améliorée en matière de gestion des dépenses publiques

DIS	CRS	Indicateur	Prévision	Réalisation	% atteint
1.1	1.1.1.a	No de CL possédant des plans reflétant des services publics sectoriels axés sur les besoins des pauvres et/ou des actions en matière d'investissements économiques et/ou d'investissements pouvant améliorer l'environnement local des affaires			
		1.4 Nombre de bilans annuels réalisés	23	23	100.00
		1.5 Nombre d'hommes et de femmes participant aux bilans annuels (communes et sections)	1700	0	0.00
		2.1 Nombre de projets du PIC/PIE cofinancés par le PIP	4	4	100.00
		2.2 Nombre de projets du PIC financés par FIC, FE et autres fonds	30	57	190.00
		2.3 Pourcentage de fonds interne par rapport aux fonds externes	10	0	0.00
		2.6 Allocation des fonds FENU se réduit progressivement (% par an)	0	0	0.00
1.1	1.1.2.a	No de CL avec des plans et budgets exécutés à temps et d'une manière efficiente (écart < 20%)			
		2.7 Nombre de collectivités territoriales ayant fait l'objet d'audit sur les fonds alloués à travers le projet	8	2	25.00
		2.8 Nombre d'autorités locales respectant les normes de gestion comptable et financière	72	72	100.00

1.1	1.1.4.a	No de CL avec des améliorations dans la mobilisation des ressources locales (per capita/an)			
	4.1	Nombres de planteurs/cultivateurs qui appliquent des nouvelles techniques de conservation du sol	300	114	38.00
	4.2	Nombre de ménages bénéficiant d'activités agroalimentaires génératrices de revenus	80	591	738.75
	4.3	Nombres d'encadreurs locaux vulgarisant les techniques de gestion durables des RN		80	0 0.00
	4.4	Nombre d'hectares aménagés, consolidés et mis en défens		200	0 0.00

12/20/2008 1:12:08 PM

Page1

Projet HAI/05/C01 Gouvernance locale dans le Nord-Est
Démarrage 01/01/2005 **Fin** 31/12/2009

CCP.1 Rapport annuel de HAITI		Date de référence 2008-12-31			
DIS	CRS	Indicateur	Prévision	Réalisation	% atteint
		1.1.1 Nombre de bilans (communaux et de sections communales) annuels réalisés	23	23	100.00
		1.1.2 Nombre de PDL (PIC et PIE) révisés	0	0	0.00
		1.1.3 Nombre de parlementaires du Nord-Est sensibilisés	2	2	100.00
		1.1.4 Nombre de diffusion de la série de 12 émissions	234	234	100.00
		1.1.5 Nombre d'élus et cadres formés et nombre de séminaires organisés	244	216	88.52
		1.1.6 Nombre de cadres (H/F) du projet et d'autres partenaires de terrain formés	41	26	63.41
		1.1.7 Nombre de diffusion des émissions	4	4	100.00
		1.1.8 Nombre de journées célébrées	3	3	100.00
		1.1.9 Nombre de PIC et PIE distribués	300	475	158.33
		1.1.10 Nombre de visites et visiteurs (H/F)	4	4	100.00
		1.1.11 Nombre d'acteurs locaux sensibilisés/formés	60	53	88.33
		1.2.1 Nombre de CCC et CS appuyés et fonctionnels	18	18	100.00
		1.2.2 Nombre de CCSC appuyés et fonctionnels	9	9	100.00
		1.2.3 Nombre de membres de structures locales et d'organisation de base formés et/ou structuré	80	91	113.75
		1.2.4 Nombre de personnes (80% F) maîtrisant les techniques de lecture et d'écriture en créole	350	663	189.43
		1.2.5 % de femmes membres des CCC et CCSC	0	0	0.00
		1.3.1 Nombre de CCC et CS appuyés et fonctionnels dans les nouvelles communes	24	24	100.00
		1.3.2 Nombre de CCSC appuyés et fonctionnels dans les nouvelles sections communales	13	7	53.85
		1.3.3 Nombre d'acteurs locaux formés en gestion de projets développement	60	60	100.00
		1.3.4 Pourcentage de femmes occupants des postes dans les CCC	0	0	0.00

Projet HAI/05/C01 Gouvernance locale dans le Nord-Est
Démarrage 01/01/2005 **Fin** 31/12/2009

CCP.1 Rapport annuel de HAITI		Date de référence 2008-12-31			
DIS	CRS	Indicateur	Prévision	Réalisation	% atteint
		1.4.1 Nombre de comité de suivi constitués et restructurés	6	6	100.00
		1.4.2 Nombre d'outils de suivi produits et/ou adaptés	5	4	80.00
		1.4.3 Nombre de séminaires organisés à l'intension des agents de suivi	4	4	100.00
		1.4.4 Nombre de sessions de formation réalisées à l'intention des structures de suivi	6	5	83.33
		1.6 % de femmes engagées au niveau du CCC et du CCSC	50	34	68.00
		1.7 % de femmes engagées au niveau du Comité Exécutif	40	31	77.50
		1.8 Pourcentage de femmes engagées au niveau des Comités de suivi	40	35	87.50
		1.9 % de femmes engagées comme agentes de suivi	50	50	100.00
		1.10 Nombre de bilans communaux annuels accessibles au public	8	7	87.50
		2.1.1 Nombre de réunions du comité renouvelé tenues sur la répartition du budget annuel d'investissement	1	1	100.00
		2.1.2 Nombre de membres de comité de gestion formés	84	84	100.00
		2.1.3 Nombre de microprojets financés avec fonds externes au projet	20	26	130.00
		3.1.1 Nombre de projets d'infrastructure achevés		18	18 100.00
		3.1.2 Nombre de nouveaux projets sélectionnés	20	25	125.00
		3.1.3 Nombre de dossiers de projets élaborés	20	22	110.00
		3.1.4 Nombre d'accords signés	20	20	100.00
		3.1.5 Nombre de projets appuyés	30	36	120.00
		4.1.1 Nombre de planteurs/cultivateurs membres d'organisations formés	170	172	101.18
		4.1.2 Nombre de conférences (2) organisée et nombre de professeurs (30) et d'élèves (800)	832	832	100.00
		4.1.3 Nombre d'hectares aménagés	200	225	112.50
		4.1.4 Nombre de collectivités accompagnées dans l'application de la législation environnementale	2	2	100.00

Projet HAI/05/C01 Gouvernance locale dans le Nord-Est
Démarrage 01/01/2005 **Fin** 31/12/2009

CCP.1 Rapport annuel de HAITI		Date de référence 2008-12-31			
DIS	CRS	Indicateur	Prévision	Réalisation	% atteint
		4.1.5 Nombre de collectivités accompagnées dans la consolidation des acquis en matière environnementale	6	9	150.00
		4.2.1 Nombre de groupements renforcés	8	8	100.00
		4.2.2 Nombre de visites d'échange réalisées	4	4	100.00
		4.2.3 Nombre de fillères promues	2	3	150.00
		4.2.4 Nombre d'initiatives porteuses appuyées	4	8	200.00
		4.2.5 Nombre d'IMF concernées par le diagnostic actualisé	2	2	100.00
		5.1 Nombre d'actions/décisions au niveau central s'inspirant des pratiques du projet	1	1	100.00
		5.1.1 Nombre de bulletins produits	2	2	100.00
		5.1.2 Nombre d'ateliers participés	6	7	116.67
		5.1.3 Nombre de TRC appuyés	4	6	150.00
		5.1.4 Nombre de réunion tripartite tenue	1	1	100.00
		5.2 Nombre d'actions/décisions au niveau d'autres bailleurs, projets s'inspirant des pratiques du projet	1	1	100.00
		5.3 Nombre de partenaires de développement du département du Nord-Est appliquant les leçons apprises	1	1	100.00
		5.4 Nombre de rencontre de la table ronde de concertation	4	4	100.00
		6.1.1 Pourcentage du budget utilisé	4	3	75.00
		6.1.2 Pourcentage du budget utilisé	6.23	6.08	97.59
		6.1.3 Pourcentage du Budget	5.88	6	102.04
		6.1.4 Pourcentage du Budget	1	0.12	12.00
		6.1.5 N/A	0	0	0.00
		6.1.6 Nombre de mission	2	1	50.00

ANNEXE 3 : Liste des microprojets financés

INVESTISSEMENTS PRIORISES PAR LES ACTEURS LOCAUX ANNEE 2008

No	MICROPROJETS	LOCALISATION	SECTEUR	BUDGET	DECAISSEMENTS
1	Assainissement des rues du bourg (Fin 2e Phase)	Carice/Bourg	Infrastructure	195,000.00	195,000.00
2	Appui à la production d'igname	Bois Gamel	Infrastructure	63,000.00	63,000.00
3	Unité de transformation Canne à sucre	Bois Gamel	Agroindustrie	520,000.00	520,000.00
4	Signalisation des rues du bourg	Capotille	Infrastructure	120,248.00	120,248.00
5	Equipement du Centre Ménager	Capotille	Infrastructure	339,805.00	339,805.00
6	Construction local Radio communautaire	Capotille	Infrastructure	468,980.00	468,980.00
7	Assainissement des rues du bourg (2e Phase)	Capotille	Infrastructure	800,000.00	800,000.00
8	Réhabilitation Petite Ecole Communautaire	Capotille	Infrastructure	52,900.00	52,900.00
9	Réhabilitation Ecole Communautaire Ch. Péralte	Capotille	Infrastructure	50,000.00	50,000.00
10	Unité de transformation d'arachide (moulin mamba)	Welch	Agroindustrie	630,000.00	630,000.00
11	Construction d'un dispensaire	Lamine	Infrastructure	1,199,534.00	1,199,534.00
12	Construction complexe Administratif	Mombin Crochu	Infrastructure	1,200,000.00	1,200,000.00
13	Unité de transformation de maïs	Sans Souci	Agroindustrie	340,660.40	340,660.40
14	Réhabilitation système eau potable Nan Sylvestre	Bois de Laurence	Eau Potable		

INVESTISSEMENTS PRIORISES PAR LES ACTEURS LOCAUX ANNEE 2008

No	MICROPROJETS	LOCALISATION	SECTEUR	BUDGET	DECAISSEMENTS
				42,178.80	42,178.80
15	Réhabilitation système eau potable Logate	Bois de Laurence	Eau Potable	157,429.40	157,429.40
16	Achèvement place publique	Mont-Organisé	Infrastructure	300,000.00	300,000.00
17	Unité transformation de café	Mont-Organisé	Agroindustrie	600,000.00	600,000.00
18	Agriculture intégrée à Lapierre	Bois Poux	Agriculture	1,400,000.00	1,400,000.00
19	Semences améliorées, pois, maïs, igname, légumes	Bois Poux	Agriculture	499,125.00	499,125.00
20	Petit matériel Ecole Nationale Bois Poux	Bois Poux	Education	49,435.00	49,435.00
21	Centre ménager à Lacuève (achèvement)	Savanette	Education	350,000.00	350,000.00
22	Extension production igname à Savanette	Savanette	Agriculture	90,000.00	90,000.00
23	Renforcement cassaverie Goden	Savanette	Agroindustrie	392,566.00	392,566.00
24	Restauration et équipement BASEC	Savanette	Infrastructure	58,500.00	58,500.00
25	Appui au redémarrage du centre de stockage	Savanette	Commerce	255,405.00	255,405.00
26	Culture maraîchère Lacroix	Savanette	Agriculture	32,850.00	32,850.00
27	Aménagement du marché	Ouanaminthe	Infrastructure	375,000.00	375,000.00
28	Réhabilitation du BASEC	Gens de Nantes	Infrastructure	130,000.00	130,000.00

INVESTISSEMENTS PRIORISES PAR LES ACTEURS LOCAUX ANNEE 2008

No	MICROPROJETS	LOCALISATION	SECTEUR	BUDGET	DECAISSEMENTS
29	Appui au redémarrage du centre de stockage	Gens de Nantes	Commerce	113,895.00	113,895.00
30	Extension du dispensaire	Savanne Longue	Infrastructure	260,119.51	260,119.51
31	Installation pompes manuelles	Savanne Longue	Eau Potable	300,000.00	300,000.00
32	Installation moulin mamba (arachide)	Savanne Longue	Agroindustrie	453,620.25	453,620.25
33	Appui au redémarrage du centre de stockage	Savanne Longue	Commerce	112,150.00	112,150.00
34	Achèvement du dispensaire	Savanne au Lait	Infrastructure	425,734.00	425,734.00
35	Moulin céréales	Perches	Agroindustrie	1,000,000.00	1,000,000.00
36	Aménagement Bureau Mairie	Perches	Infrastructure	48,918.00	48,918.00
37	Piste rurale Haut des Perches	Haut des Perches	Infrastructure	390,500.00	390,500.00
38	Valorisation Petits Périmètres Irrigués à Gaston	Haut des Perches	Agriculture	1,010,378.00	1,010,378.00
39	Conservation intégrée de sols	Bas des Perches	Environnement	357,361.80	357,361.80
40	Construction complexe administratif (achèvement)	Vallières	Infrastructure	848,384.80	848,384.80
41	Controle scolyte dans le café (achèvement)	Vallières	Agriculture	245,712.00	245,712.00
42	Réhabilitation Trois Palmistes/Vyé Baryè (fin)	Trois Palmistes	Infrastructure	43,921.00	43,921.00

INVESTISSEMENTS PRIORISES PAR LES ACTEURS LOCAUX ANNEE 2008

No	MICROPROJETS	LOCALISATION	SECTEUR	BUDGET	DECAISSEMENTS
43	Conservation intégrée de sols	Trois Palmistes	Environnement	500,050.00	500,050.00
44	Achèvement percée Corosse/Mombin	Corosse	Infrastructure	350,000.00	350,000.00
46	Construction complexe administratif (achèvement)	Ste Suzanne	Infrastructure	117,632.60	117,632.60
47	Extension eau potable à Cité Max	Fort-Liberté	Infrastructure	200,000.00	200,000.00
48	Forage puits pour bassin piscicole APSJ	Fort-Liberté	Pêche	18,750.00	18,750.00
49	Achat mégaphone pour Casec			25,712.00	25,712.00
	INVESTISSEMENT TOTAL FIC-FE			17,535,455.56	17,535,455.56
